

CAPA- 2026

CURSO

GERENCIAMENTO DE PROJETOS

OBJETIVO DA DISCIPLINA:

“Analisar os Princípios Básicos de Gerência de Projetos de Sistemas, Sistemas de Sistemas (SoS) de Pequena ou Grande Complexidade para a MB.”

UNIDADES DE ENSINO

- U.E. 1 – **Fundamentos** do Gerenciamento de Projetos.
- U.E. 2 – Gerenciamento de **Escopo** do Projeto.
- U.E. 3 – Gerenciamento da **Qualidade** do Projeto.
- U.E. 4 – Gerenciamento do **Cronograma** do Projeto.
- U.E. 5 – Gerenciamento dos **Custos** do Projeto.
- U.E. 6 – Gerenciamento dos **Recursos** do Projeto.
- U.E. 7 – Gerenciamento de **Aquisições** do Projeto.

UNIDADES DE ENSINO

U.E. 8 – Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto.

U.E. 9 – Gerenciamento das Comunicações do Projeto.

U.E. 10 – Gerenciamento de Riscos do Projeto.

U.E. 11 – Gerenciamento de Integração do Projeto.

U.E. 12 – Métodos Ágeis.

U.E. 13 – Estudo Prático Monitorado.

UNIDADE 1- FUNDAMENTOS DO GP

SUBUNIDADES:

SUN 1.1 – Conceitos e Definições.

SUN 1.2 – O Ambiente de Projetos.

SUN 1.3 – O Papel do Gerente de Projetos.

SUN 1.4 – Melhores Práticas de GP.

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, **ferramentas** e técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir os seus **requisitos**. O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e integração apropriadas dos **Processos** de Gerenciamento identificados para o projeto. O Gerenciamento de Projetos permite que as organizações executem projetos de forma eficaz e eficiente (**efetividade**).

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

O gerenciamento de projetos não é novo. Tem sido usado por centenas de anos. Entre alguns exemplos de resultados de projeto estão:

- As Pirâmides de Gizé;**
- Os Jogos Olímpicos;**
- A publicação de um livro infantil;**
- O desenvolvimento de aeronaves comerciais;**
- Desenvolvimento de Vacinas;**
- Estações Espaciais;**
- Os aplicativos de software comerciais.**

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Exemplos de projetos incluem, mas não estão limitadas a:

- Desenvolvimento de um novo produto farmacêutico para o mercado;**
- Expansão de um serviço de guia turístico;**
- Fusão de duas organizações;**
- Melhoria de um processo de negócio em uma organização;**
- Aquisição e instalação de um novo sistema de hardware de computador para ser usado em uma organização;**

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Exemplos de projetos incluem, mas não estão limitadas a:

- Exploração de petróleo em uma região;**
- Modificação de um programa de software usado em uma organização;**
- Realização de pesquisas para desenvolver um novo processo de fabricação; e**
- Construção de um edifício.**

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Benefícios do Gerenciamento de Projetos:

“ Uma pesquisa realizada pelo PMI mostra que Organizações que investem em práticas de gerenciamento de projetos, comprovadas, desperdiçam 28 vezes menos dinheiro, porque um número maior de iniciativas estratégicas são concluídas com êxito.”

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

O gerenciamento de projetos eficaz ajuda indivíduos, grupos e organizações públicas e privadas a:

- Cumprirem os objetivos do negócio;**
- Satisfazerem as expectativas das Partes Interessadas;**
- Serem mais previsíveis;**
- Aumentarem suas chances de sucesso;**
- Entregarem os produtos certos no momento certo;**
- Resolverem problemas e questões;**

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

- **Responderem a riscos em tempo hábil;**
- **Otimizarem o uso dos recursos organizacionais;**
- **Identificarem, recuperarem ou eliminarem projetos com problemas;**
- **Gerenciarem restrições (por exemplo, escopo, qualidade, cronograma, custos, recursos);**
- **Equilibrarem a influência de restrições do projeto (por exemplo, o aumento de escopo pode aumentar custos ou o prazo); e**
- **Gerenciarem melhor as mudanças.**

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

- **Responderem a riscos em tempo hábil;**
- **Otimizarem o uso dos recursos organizacionais;**
- **Identificarem, recuperarem ou eliminarem projetos com problemas;**
- **Gerenciarem restrições (por exemplo, escopo, qualidade, cronograma, custos, recursos);**
- **Equilibrarem a influência de restrições do projeto (por exemplo, o aumento de escopo pode aumentar custos ou o prazo); e**
- **Gerenciarem melhor as mudanças.**

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Benefícios do Gerenciamento de Projetos:

- **Evita surpresas durante a execução do trabalho;**
- **Permite desenvolver diferenciais competitivos e novas técnicas, uma vez que toda uma metodologia está sendo estruturada;**
- **Antecipa as situações desfavoráveis que poderão ser encontradas, para que ações preventivas e corretivas possam ser tomadas antes que essas situações se consolidem como problemas;**
- **Adapta os trabalhos ao cliente;**

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Benefícios do Gerenciamento de Projetos:

- **Disponibiliza os orçamentos antes do início dos gastos;**
- **Agiliza as decisões, já que as informações estão estruturadas e disponibilizadas;**
- **Aumenta o controle gerencial de todas as fases implementadas devido ao detalhamento ter sido realizado;**

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Benefícios do Gerenciamento de Projetos:

- **Facilita e orienta as revisões da estrutura do projeto que forem decorrentes de modificações no mercado ou no ambiente competitivo, melhorando a capacidade de adaptação do projeto;**
- **Otimiza a alocação de pessoas, equipamentos e materiais necessários;**
- **Documenta e facilita as estimativas para futuros projetos.**

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

**“PROJETO É UM ESFORÇO
TEMPORÁRIO EMPREENDIDO
PARA CRIAR UM PRODUTO,
SERVIÇO OU RESULTADO
ÚNICO.”** (PMBOK 6ª Edição)

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

“PROJETO É UM EMPREENDIMENTO NÃO REPETITIVO, CARACTERIZADO POR UMA SEQUÊNCIA CLARA E LÓGICA DE EVENTOS, COM INÍCIO, MEIO E FIM, QUE SE DESTINA A ATINGIR UM OBJETIVO CLARO E DEFINIDO, SENDO CONDUZIDO POR PESSOAS, DENTRO DE PARÂMETROS PRÉDEFINIDOS DE TEMPO, CUSTO, RECURSOS ENVOLVIDOS E QUALIDADE.

(Manual Prático do Plano de Projeto – Ricardo Vargas - 6ª Ed)

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

As principais características dos projetos são a **Temporalidade** e a **Individualidade** do produto ou serviço a ser desenvolvido pelo projeto, a complexidade e a incerteza.

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

A **Temporalidade** significa que todo projeto apresenta um início e um fim definidos, ou seja, é um evento de duração finita, determinada em seu objetivo.

Individualidade do produto ou serviço produzido pelo projeto significa realizar algo novo, que não tinha sido realizado antes. Como o produto de cada projeto é único, suas características precisam ser elaboradas de maneira progressiva de modo a garantir as especificações do produto ou serviço a ser desenvolvido. Para entender Individualidade, basta saber que projeto é o oposto de rotina.

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Empreendimento temporário.

A natureza temporária dos projetos indica que eles tem um início e um término definidos. Temporário não significa necessariamente que o projeto seja de curta duração. O final do projeto é alcançado quando ocorrer um ou mais dos fatores a seguir:

- Os objetivos do projeto foram alcançados;**
- Os objetivos não serão ou não poderão ser cumpridos;**
- Os recursos estão esgotados ou não estão mais disponíveis para alocação ao projeto;**

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Empreendimento Temporário.

- A necessidade do projeto não existe mais (por exemplo, o cliente não quer mais o projeto concluído, uma mudança de estratégia ou de prioridade encerram o projeto, o gerenciamento organizacional fornece uma instrução para terminar o projeto);**
- Recursos humanos e físicos não estão mais disponíveis; ou**
- O projeto é finalizado por motivo legal ou por conveniência.**

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

A partir das características de **Temporalidade** e da **Individualidade**, pode-se elencar as demais:

- **Empreendimento Não Repetitivo:**

É um evento que não faz parte da rotina da empresa. É algo novo para as pessoas que o irão realizar.

- **Sequencia Clara e Lógica de Eventos**

O projeto é caracterizado por atividades encadeadas logicamente, de modo a permitir que, durante a execução, o acompanhamento e o controle sejam precisos.

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

- **Início, meio e Fim:**

Todo projeto respeita um determinado ciclo de vida. Um projeto que não tem término não é um projeto, é rotina.

- **Objetivo Claro e Definido:**

Todo projeto tem metas e resultados bem estabelecidos, a serem atingidos em sua finalização.

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

- **Conduzido por pessoas:**

O cerne fundamental de qualquer projeto são as pessoas que vão executar e atuar como as Partes Interessadas no Projeto. Sem as pessoas, não existe projeto.

- **Projetos Utilizam Recursos:**

Todo projeto utiliza recursos especificadamente alocados a determinados trabalhos.

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

- **Parâmetros Predefinidos:**

Todo projeto necessita ter estabelecidos valores para prazos, custos, pessoal, material e equipamentos envolvidos, bem como a qualidade desejada para o projeto. É impossível estabelecer, previamente, com total precisão, esses parâmetros. Todos eles serão claramente identificados e quantificados no decorrer do Plano do Projeto. Entretanto, os parâmetros iniciais vão atuar como referências para o projeto e sua avaliação.

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Elementos repetitivos podem estar presentes em algumas Atividades e Entregas de Projeto. Esta repetição não altera as características fundamentais e exclusivas do trabalho do projeto. Por exemplo, prédios de escritórios podem ser construídos com materiais idênticos ou similares e pelas mesmas equipes ou equipes diferentes. No entanto, o projeto de cada prédio é único em termos de características-chave (por exemplo, localização, design, ambiente, situação, pessoas envolvidas).

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

PRODUTO, SERVIÇO OU RESULTADO ÚNICO:

- **Projetos** são realizados para cumprir Objetivos através da produção de Entregas.
- Um **Objetivo** é definido como um resultado a que o trabalho é orientado, uma Posição Estratégica a ser alcançada ou um Propósito a ser atingido, um Produto a ser produzido ou um Serviço a ser realizado.
- Uma **Entrega** é definida como qualquer produto, resultado ou capacidade única e verificável que deve ser produzida para concluir um Processo, Fase ou Projeto. As entregas podem ser Tangíveis ou Intangíveis.

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

TIPOS DE ENTREGA:

- Um **produto único** que pode ser um componente de outro item, um aprimoramento ou correção de um item, ou um novo item final (por exemplo, a correção de um defeito em um item final);
- Um **serviço único** ou uma capacidade de realizar um serviço (por exemplo, uma função de negócios que dá suporte à produção ou distribuição);

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

TIPOS DE ENTREGA:

- Um **resultado único**, como um produto ou documento (por exemplo, um projeto de pesquisa que desenvolve o conhecimento que pode ser usado para determinar se uma tendência existe ou se um novo processo beneficiará a sociedade); e
- Uma **combinação única** de um ou mais produtos, serviços ou resultados (por exemplo, um aplicativo de software, a documentação associada e serviços de centrais de atendimento).

1.1 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Os projetos **mal gerenciados** ou a ausência do gerenciamento de projetos podem resultar em:

- Prazos perdidos;
- Estouros de orçamento;
- Má qualidade;
- Retrabalho;
- Expansão descontrolada do projeto;
- Perda de reputação para a organização;
- Partes Interessadas insatisfeitas;
- Incapacidade de alcançar os objetivos para os quais o projeto foi empreendido.

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS


Projetos impulsionam mudanças.

Projetos impulsionam mudanças nas organizações. Do ponto de vista de negócios, um projeto destina-se a mover uma organização de um estado a outro, para atingir um objetivo específico

Antes que o projeto comece, a organização é comumente referenciada como estando no Estado Atual. O resultado desejado da mudança impulsionada pelo projeto é chamado de Estado Futuro.

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

Projetos impulsionam mudanças.

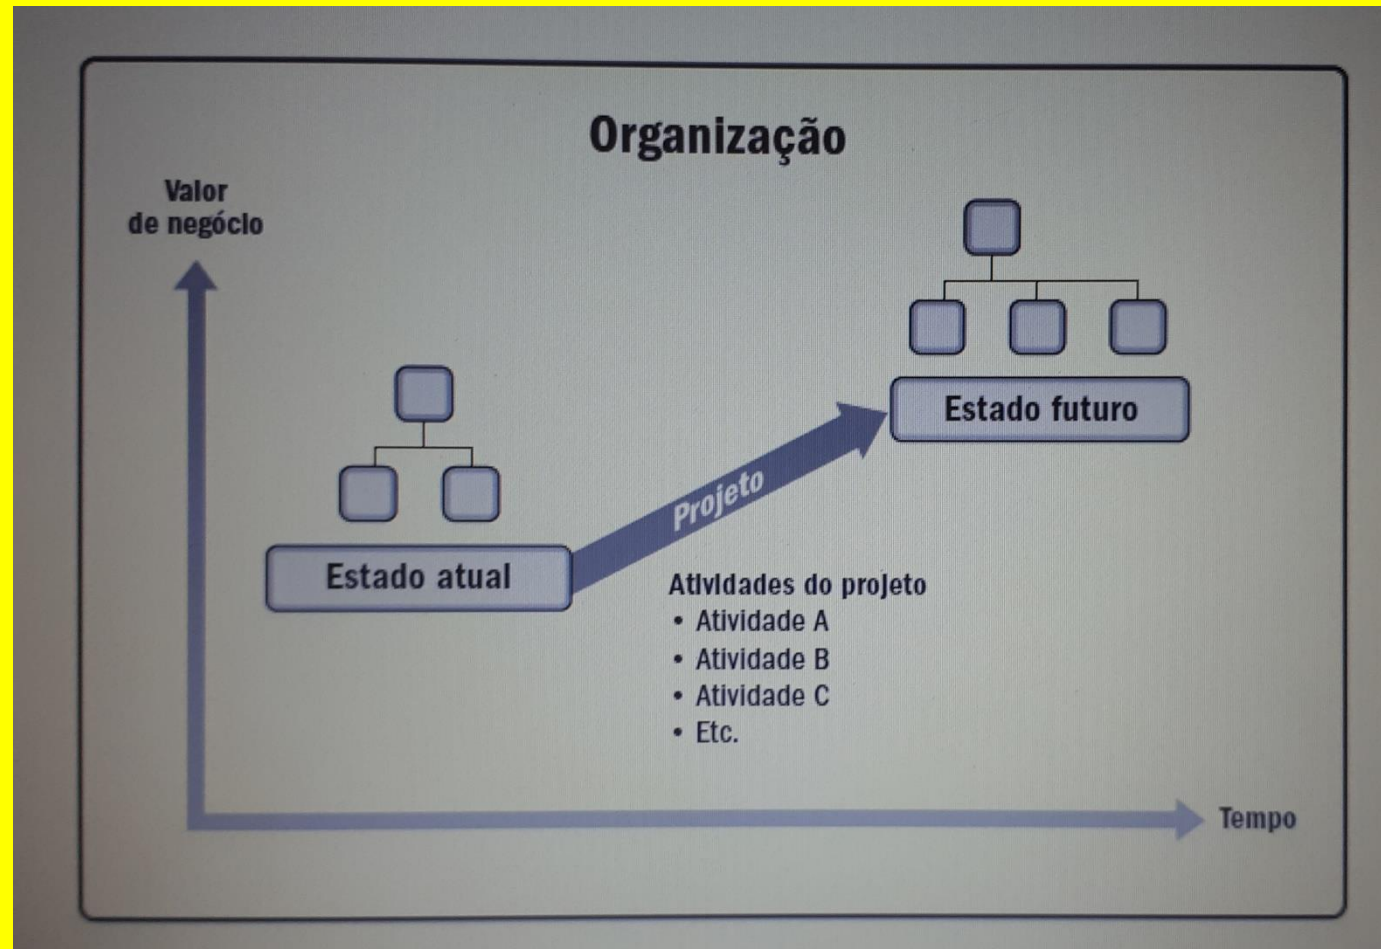

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

Os projetos permitem a criação de valor de negócio.

- **O valor de negócios em projetos refere-se ao benefício que os resultados de um projeto específico fornece as suas Partes Interessadas. O benefício dos projetos pode ser tangível, intangível ou ambos.**

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

Os projetos permitem a criação de valor de negócio.

Exemplos de elementos tangíveis:

- **Ativos monetários,**
- **Capital acionário,**
- **Serviços públicos,**
- **Instalações,**
- **Ferramentas, e**
- **Participação de mercado.**

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

Os projetos permitem a criação de valor de negócio.

Exemplos de elementos intangíveis:

- **Boa-fé,**
- **Reconhecimento da marca,**
- **Benefício público,**
- **Marcas registradas,**
- **Alinhamento estratégico, e**
- **Reputação.**

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS


O gerenciamento de projetos eficaz e eficiente deve ser considerado uma **competência estratégica** nas organizações. Isso permite que as organizações:

- Vinculem os resultados do projeto com os objetivos do negócio;
- Concorram com mais eficácia nos seus mercados;
- Sustentem a organização; e
- Respondam ao impacto das mudanças de ambiente de negócios nos projetos, ajustando adequadamente os Planos de Gerenciamento de Projetos.

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

Os projetos são uma maneira chave de criar valor e benefícios nas organizações. No ambiente de negócios atual, os líderes organizacionais precisam ser capazes de gerenciar **orçamentos cada vez mais apertados, prazos mais curtos, recursos mais escassos e uma tecnologia que muda rapidamente**. O ambiente de negócios é dinâmico, com um ritmo acelerado de mudança. Para se manterem competitivas na economia mundial, as empresas estão adotando o gerenciamento de projetos para entregar valor de negócio de forma consistente.


1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

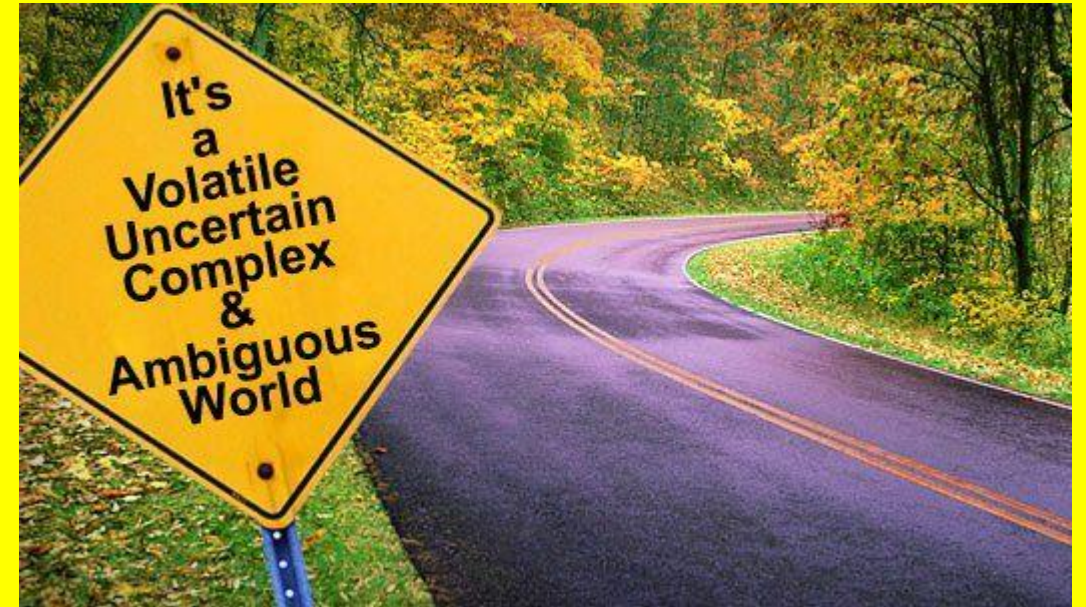

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

Projetos são empreendidos em todos os níveis organizacionais. Um projeto pode envolver um único indivíduo ou um grupo. Um projeto pode envolver uma única organização ou múltiplas Unidades Organizacionais de múltiplas Organizações.

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

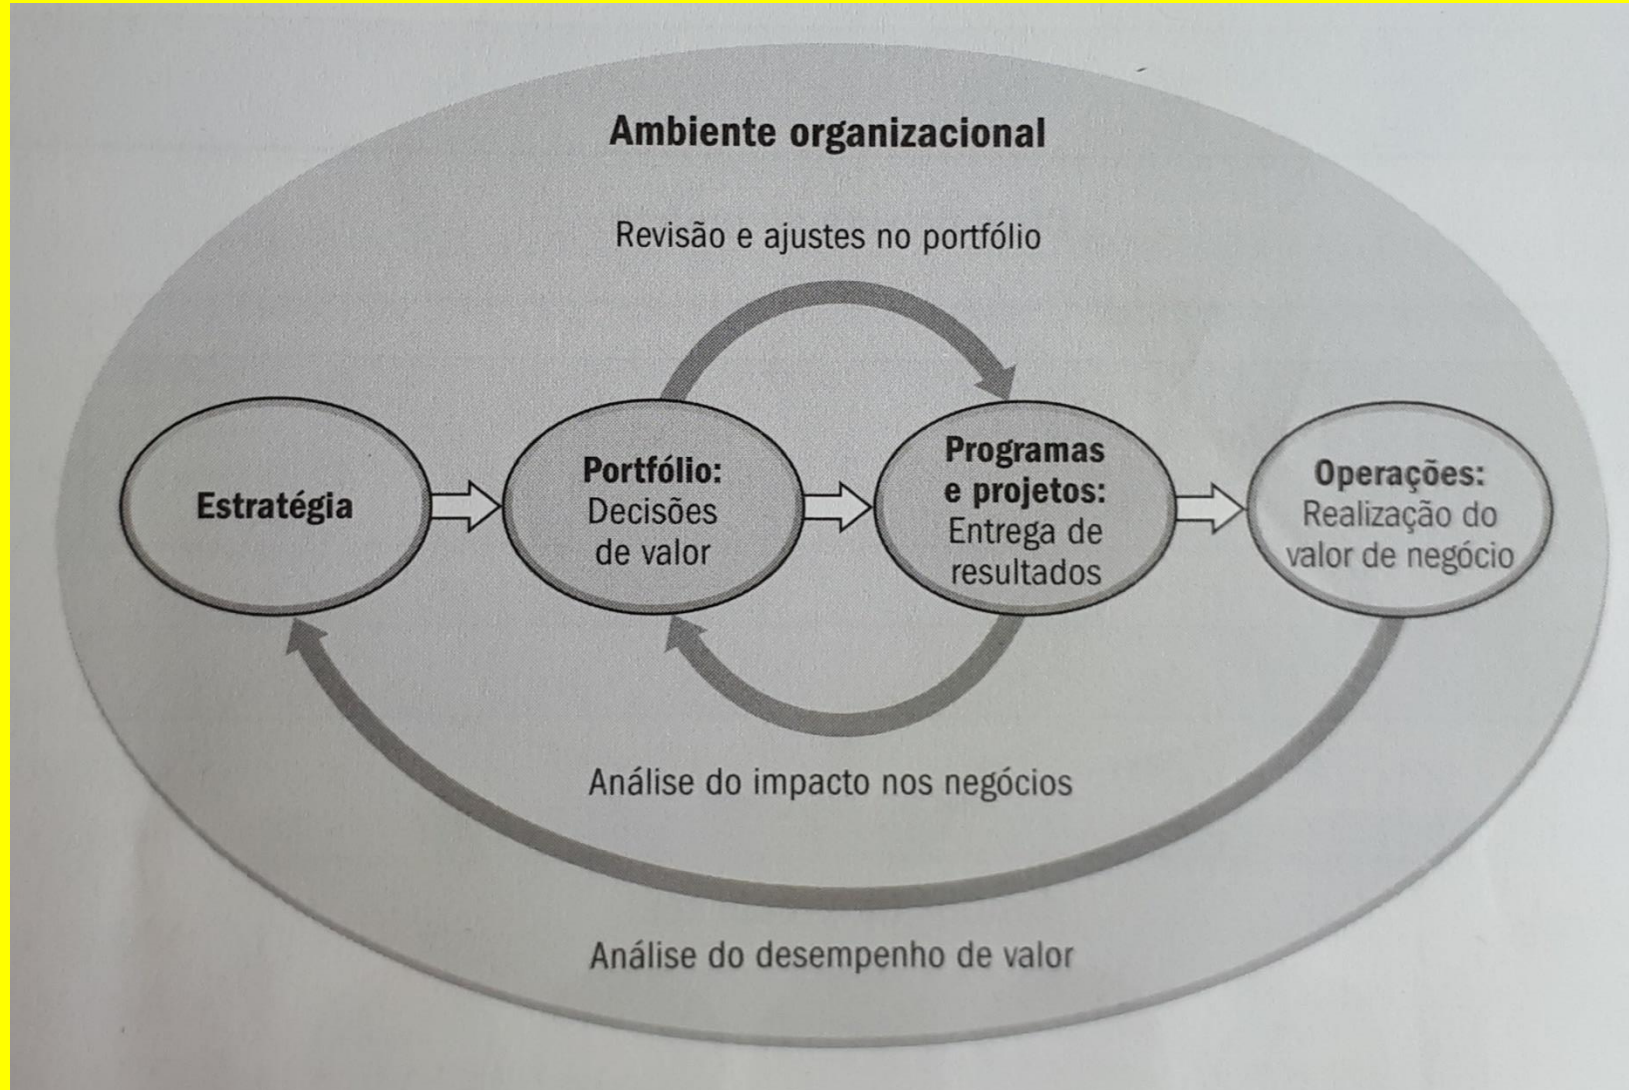

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS


Contexto de Iniciação do Projeto.

Os líderes organizacionais iniciam projetos em resposta a fatores que afetam as suas organizações. Há quatro categorias fundamentais desses fatores que ilustram o contexto de um projeto:

- Cumprir requisitos regulatórios, legais ou sociais;**
- Atender a pedidos ou necessidades das Partes Interessadas;**
- Implementar ou alterar estratégias de negócio ou tecnológicas; e**
- Criar, melhorar ou corrigir produtos, processos ou serviços.**

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

Contexto de Iniciação do Projeto.

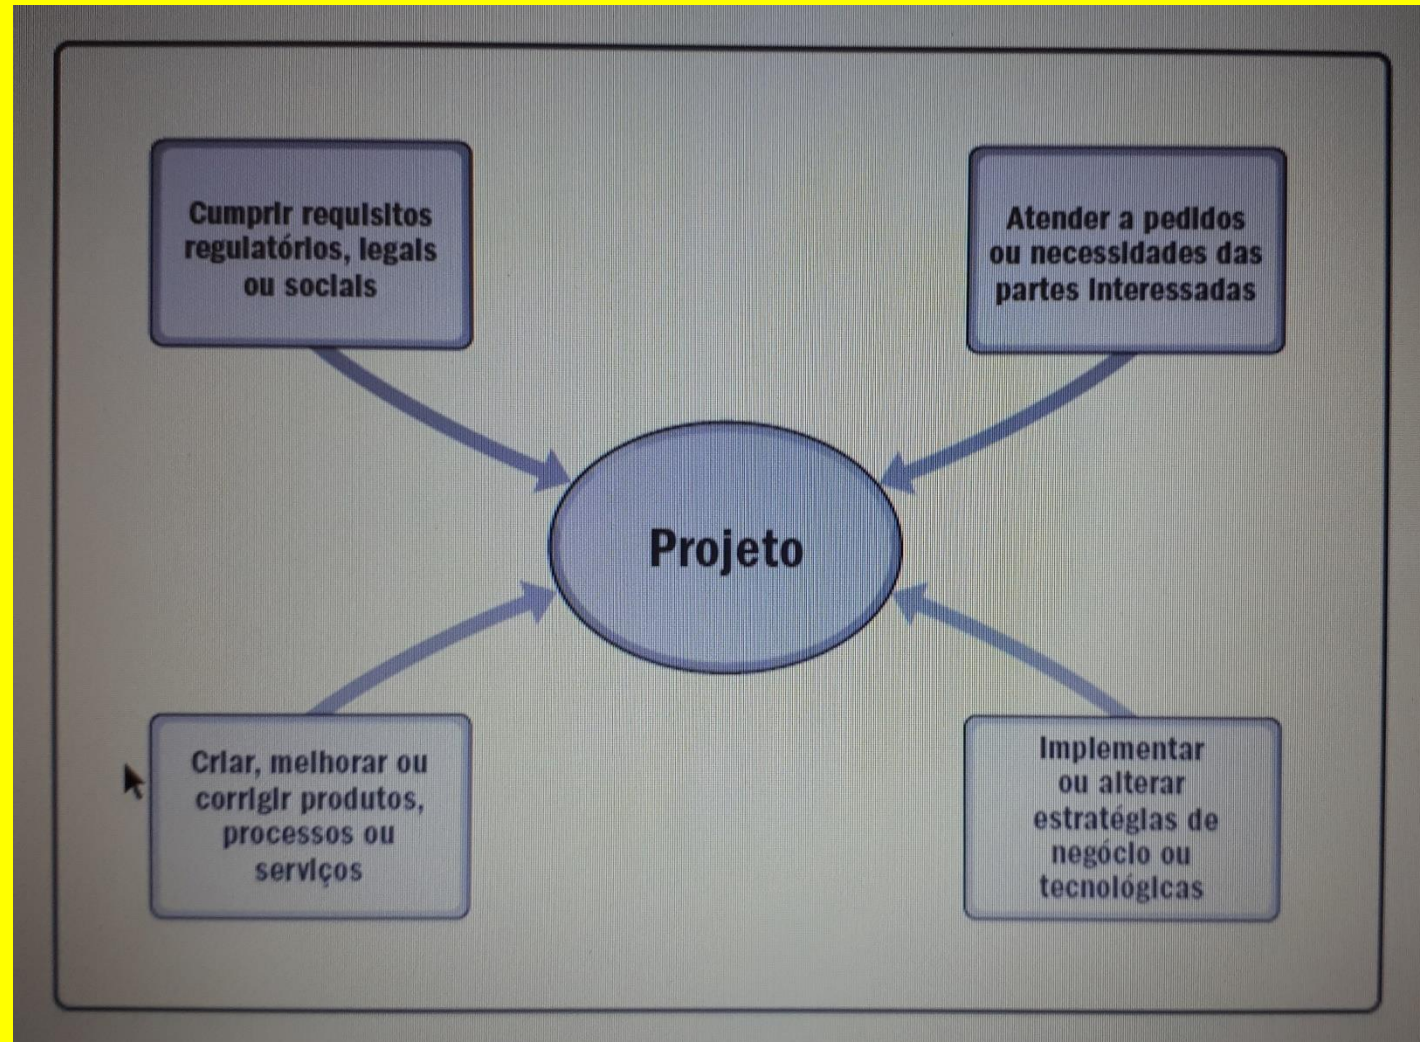


1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

- Os projetos existem e operam em ambientes que podem ter influência sobre eles. Essas influências podem ter um impacto favorável ou desfavorável sobre o projeto.
- Duas importantes categorias de influência são os **Fatores Ambientais da Empresa (FAEs)** e os **Ativos de Processos Organizacionais (APOs)**.

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

- Os **FAEs** originam-se do ambiente externo do projeto e, muitas vezes, externo a empresa. Os **FAEs** podem ter um impacto de nível de organização, portfolio, programa ou projeto.
- Os **APOs** são internos a organização. Podem surgir da organização em si, de um portfolio, programa, outro projeto ou uma combinação deles.

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

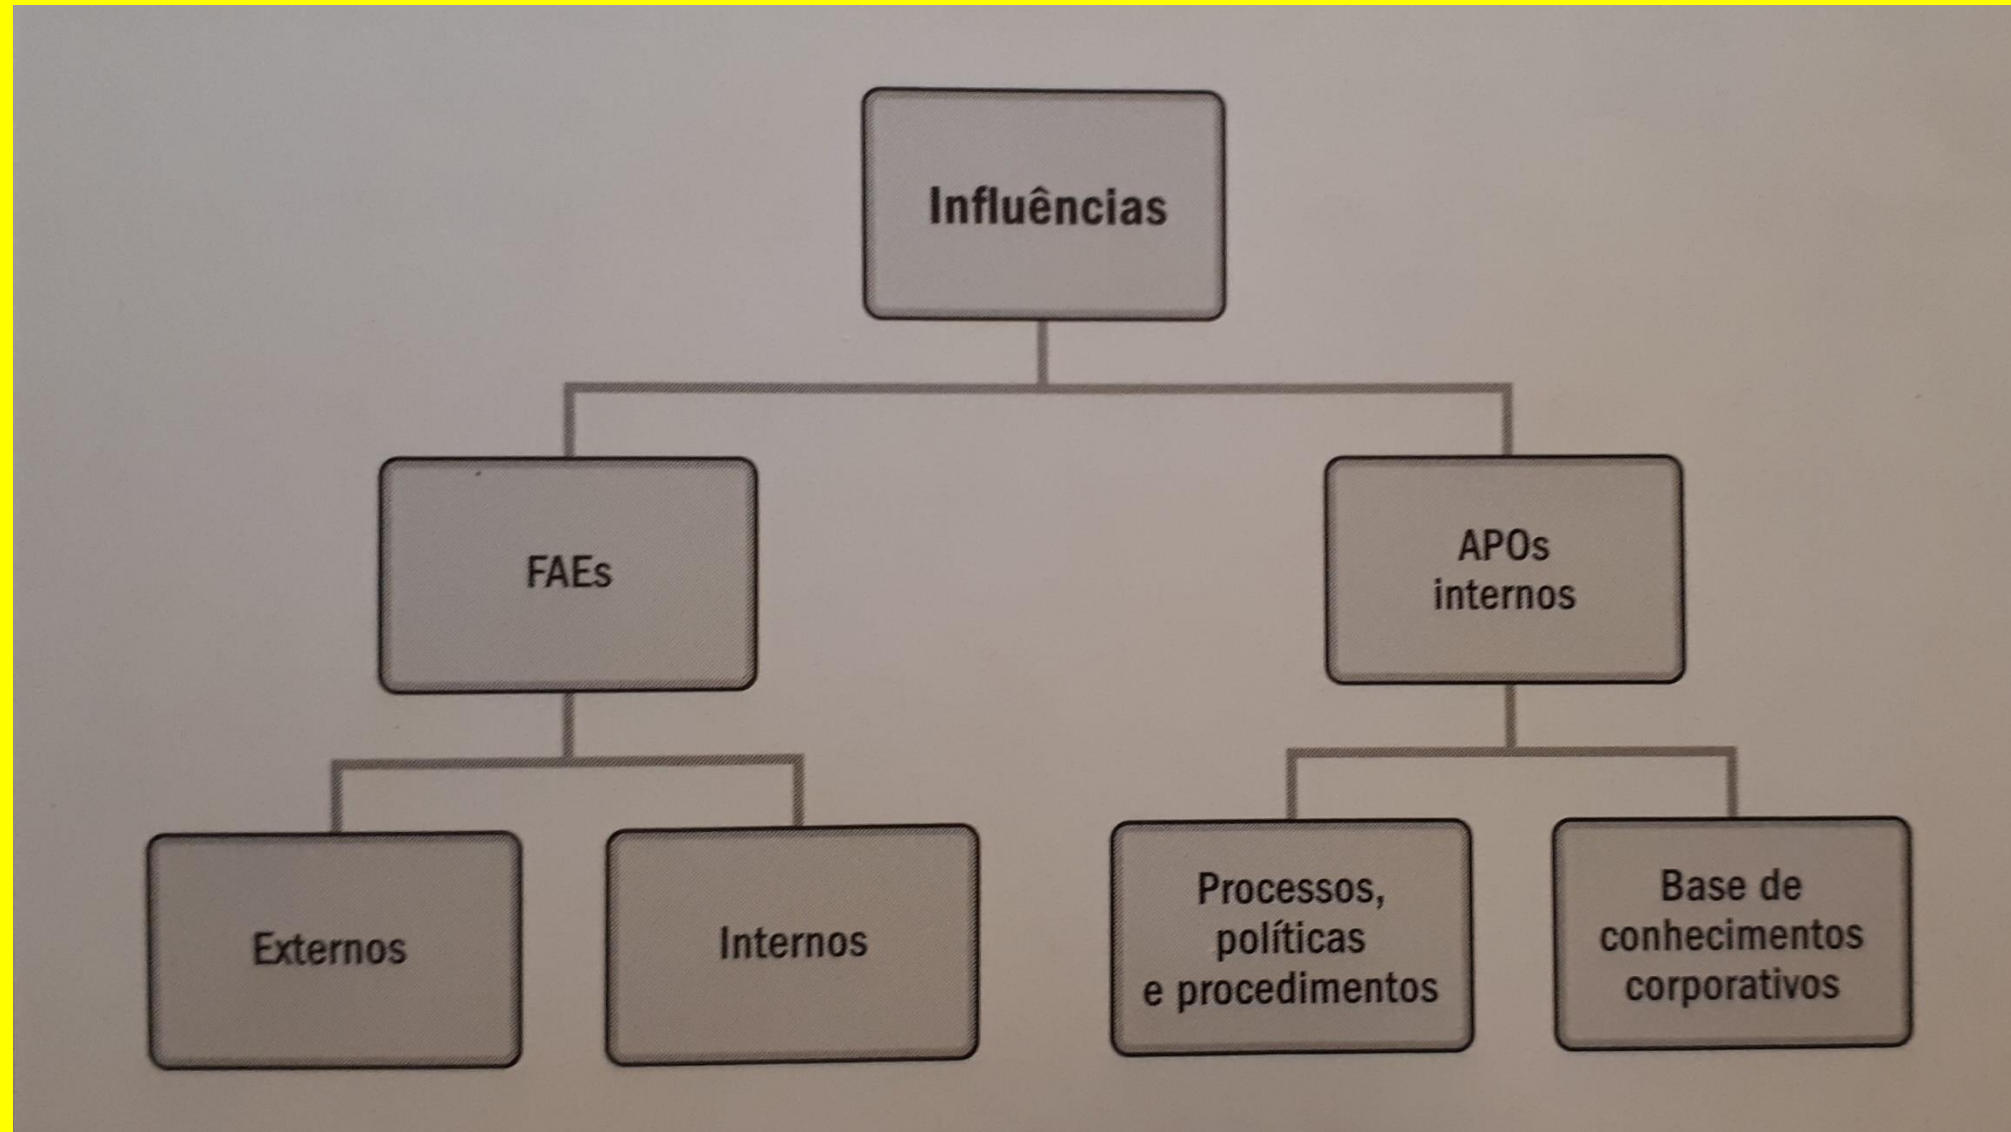

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

FATORES AMBIENTAIS DA EMPRESA

- Os fatores ambientais da empresa **(FAEs)** se referem às condições fora do controle da equipe do projeto que influenciam, restringem ou direcionam o projeto.
- Essas condições podem ser internas e/ou externas à organização.
- Os **FAEs** são considerados entradas em muitos processos de gerenciamento de projetos, em particular para a maioria dos processos de planejamento.
- Estes fatores podem aumentar ou restringir as opções de gerenciamento de projetos.

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

FATORES AMBIENTAIS DA EMPRESA

- Além disso, esses fatores podem ter uma influência positiva ou negativa sobre o resultado do projeto.
- Os **FAEs** variam muito em tipo ou natureza. Esses fatores devem ser considerados para que o projeto seja eficaz.

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

FAES INTERNOS À ORGANIZAÇÃO

- **Cultura, estrutura e governança organizacionais.**

Entre os exemplos incluem-se visão, missão, valores, crenças, normas culturais, estilo de liderança, relações de autoridade e hierarquia, estilo organizacional, ética e código de conduta.

- **Distribuição geográfica de instalações e recursos.**

Entre os exemplos incluem-se localização de fábricas, equipes virtuais, sistemas compartilhados e computação na nuvem.

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

FAES INTERNOS À ORGANIZAÇÃO

- **Infraestrutura.**

Entre os exemplos incluem-se instalações, equipamentos, canais de telecomunicações organizacionais, hardware de tecnologia da informação, disponibilidade e capacidade existentes.

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

FAES INTERNOS À ORGANIZAÇÃO

- **Software de tecnologia de informação.**

Entre os exemplos incluem-se ferramentas de software para a elaboração de cronogramas, sistemas de gerenciamento de configuração, interfaces web para outros sistemas online automatizados e sistemas de autorização de trabalho.

- **Disponibilidade de recursos.**

Exemplos incluem restrições de contratação e compras, provedores e subcontratados aprovados e acordos de colaboração.

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

FAES INTERNOS À ORGANIZAÇÃO

- **Capacidade dos funcionários.**

Entre os exemplos incluem-se expertise, habilidades, competências e conhecimentos especializados de recursos humanos existentes.

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

FAES EXTERNOS À ORGANIZAÇÃO

- **Condições de mercado.**

Concorrentes, participação no mercado, reconhecimento de marca e marcas registradas.

- **Influências e questões sociais e culturais.**

O clima político, códigos de conduta, ética e percepções.

- **Restrições legais.**

Leis e regulamentos locais e nacionais relacionados com segurança, proteção de dados, conduta de negócios, emprego e contratação.

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

FAES EXTERNOS À ORGANIZAÇÃO

- Bancos de dados comerciais.

Resultados de benchmarking, dados padronizados de estimativa de custos, informações sobre estudos de risco do setor e bancos de dados de riscos.

- Pesquisa acadêmica.

Estudos, publicações e resultados de benchmarking sobre o setor.

- Padrões governamentais ou setoriais.

Normas e regulamentações de órgãos reguladores relacionados com produtos, produção, ambiente, qualidade e mão de obra.

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

FAES EXTERNOS À ORGANIZAÇÃO

- **Considerações financeiras.**
Taxas de câmbio, taxas de juros, taxas de inflação, tarifas e localização geográfica.
- **Elementos ambientais físicos.**
Condições de trabalho, climáticas e restrições.

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

ATIVOS DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

- **Ativos de processos organizacionais (APOs)** são os planos, processos, políticas, procedimentos e bases de conhecimento específicos da organização e por ela usados. Esses ativos influenciam o gerenciamento do projeto.

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

ATIVOS DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

- Os **APOs** incluem qualquer artefato, prática ou conhecimento de uma ou todas as organizações executoras envolvidas no projeto que podem ser utilizados para executar ou administrar o mesmo.
- Os **APOs** também incluem lições aprendidas de projetos anteriores e informações históricas da organização.

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

ATIVOS DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

- Os **APOs** podem incluir cronogramas finalizados, dados sobre riscos e dados sobre valor agregado.
- Os **APOs** são entradas para muitos processos de gerenciamento de projetos.
- Como os **APOs** são internos à organização, os membros da equipe do projeto podem ser capazes de atualizar e acrescentar aos ativos de processos organizacionais, conforme necessário, durante todo o projeto.

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

ATIVOS DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

Eles podem ser agrupados em duas categorias:

- **Processos, políticas e procedimentos; e**
- **Bases de conhecimento organizacionais.**

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

Processos, políticas e procedimentos:

- Geralmente, os ativos desta categoria não são atualizados como parte do trabalho do projeto.
- São geralmente estabelecidos pelo **Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP)** ou outra função fora do projeto.

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

Processos, Políticas e Procedimentos (Iniciação e Planejamento):

- **Diretrizes** e critérios para adaptação do conjunto de processos e procedimentos padrão da organização a fim de atender as necessidades específicas do projeto;
- **Padrões organizacionais** específicos, como políticas (por exemplo, políticas de recursos humanos, de saúde e segurança, de segurança e confidencialidade, de qualidade, de aquisição e ambientais);

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

Processos, Políticas e Procedimentos (Iniciação e Planejamento):

- **Ciclos de vida de produtos e projetos, métodos e procedimentos** (por exemplo, métodos de gerenciamento de projetos, métricas de estimativas, auditorias de processos, metas de melhorias, listas de verificação e definições padronizadas de processos para uso na organização);

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

Processos, Políticas e Procedimentos (Iniciação e Planejamento):

- **Modelos** (por exemplo, planos de gerenciamento do projeto, documentos de projeto, registros de projeto, formatos de relatórios, modelos de contrato, categorias de riscos, modelos de declaração de riscos, probabilidade e definições de impactos, probabilidade e matrizes de impacto e modelos de registro das partes interessadas); e
- **Listas de fornecedores** pré-aprovados e vários tipos de acordos contratuais (por exemplo, contratos de preço fixo, de custo reembolsável e por tempo e material).

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

Processos, Políticas e Procedimentos (Execução, Monitoramento e Controle):

- **Procedimentos de gerenciamento de problemas e defeitos (por exemplo, definição de controles de defeitos e problemas, identificação e solução de problemas e defeitos e acompanhamento dos itens de ação);**
- **Controle de disponibilidade e gerenciamento de atribuição de recursos;**

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

Processos, Políticas e Procedimentos (Execução, Monitoramento e Controle):

- **Requisitos de comunicação da organização** (por exemplo, tecnologia de comunicações específica disponível, mídia de comunicação autorizada, políticas de retenção de registros, videoconferência, ferramentas colaborativas e requisitos de proteção);
- Procedimentos para priorização, aprovação e emissão de autorizações de trabalho;
- **Modelos** (por exemplo, registro dos riscos, registro das questões e registro das mudanças);

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

Processos, Políticas e Procedimentos (Execução, Monitoramento e Controle):

- Diretrizes padronizadas, instruções de trabalho, critérios de avaliação de propostas e critérios de medição de desempenho; e**
- Procedimentos de verificação e validação de produto, serviço ou resultado.**

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

Processos, Políticas e Procedimentos (Encerramento):

Diretrizes ou requisitos de encerramento do projeto (por exemplo, auditorias finais do projeto, avaliações do projeto, aceitação de entregas, encerramento de contratos, reatribuição de recursos e transferência de conhecimentos para a produção e/ou operações).

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

REPOSITÓRIOS DE CONHECIMENTO ORGANIZACIONAIS

Os repositórios de conhecimento organizacionais para armazenamento e recuperação de informações incluem, mas não estão limitados a:

- Repositórios de conhecimento de gerenciamento de configuração contendo as versões de componentes de software e hardware e linhas de base de todos os padrões, políticas e procedimentos da organização executora, e quaisquer documentos do projeto;

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

REPOSITÓRIOS DE CONHECIMENTO ORGANIZACIONAIS

- **Repositórios de dados financeiros** contendo informações como horas de mão-de-obra, custos incorridos, orçamentos e qualquer estouro dos custos do projeto;
- **Repositórios de conhecimento de informações históricas e lições aprendidas** (por exemplo, registros e documentos de projetos, todas as informações e documentação de encerramento do projeto, informações relativas aos resultados de desempenho e decisões de seleção de projetos anteriores, além de informações de atividades de gerenciamento de riscos);

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

REPOSITÓRIOS DE CONHECIMENTO ORGANIZACIONAIS

- **Repositórios de dados de gerenciamento de problemas e defeitos** contendo o status dos mesmos, informações de controle, solução de problemas e defeitos, e resultados de itens de ação;
- **Repositórios de dados de indicadores** usados para coletar e disponibilizar os dados de medições dos processos e produtos;

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

REPOSITÓRIOS DE CONHECIMENTO ORGANIZACIONAIS

- **Arquivos de projetos anteriores** (por exemplo, escopo, custo, cronograma, e linhas de base de medição do desempenho, calendários, diagramas de rede de cronograma, registros dos riscos, relatórios de riscos e registros das partes interessadas).

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

Causas de Fracassos em Projeto:

- **As metas e os objetivos são mal estabelecidos, ou não são compreendidos pelos escalões inferiores;**
- **Há pouca compreensão da complexidade do projeto;**
- **O projeto inclui muitas atividades e muito pouco tempo para realizá-las;**
- **As estimativas financeiras são pobres e incompletas;**
- **O Projeto é baseado em dados insuficientes ou inadequados;**

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

Causas de Fracassos em Projeto:

- O sistema de monitoramento e controle são inadequados;
- O projeto não teve um Gerente de Projeto, ou teve vários, criando círculos de poder paralelos aos previamente estabelecidos;
- Criou-se muita dependência no uso de softwares de gestão de projetos;

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

Causas de Fracassos em Projeto:

- **O Projeto foi estimado com base na experiência empírica, ou no feeling dos envolvidos, deixando em segundo plano os dados históricos de projetos similares, ou até mesmo análise estatísticas efetuadas;**
- **O treinamento ou a capacitação foram inadequados;**
- **Faltou liderança do Gerente de Projetos;**
- **Não foi destinado tempo para as estimativas e o planejamento;**

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

Causas de Fracassos em Projeto:

- Não se conheciam as necessidades de pessoal, equipamentos e materiais;
- Fracassou a integração dos elementos-chave do escopo do projeto;
- Cliente/projeto tinham expectativas distintas e, muitas vezes opostas;
- Não se conheciam os pontos-chaves do projeto;

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

Causas de Fracassos em Projeto:

- **Ninguém verificou se as pessoas envolvidas nas atividades tinham conhecimento necessário para executá-las;**
- **Os padrões de trabalho não foram estabelecidos.**

1.3 – O PAPEL DO GERENTE DE PROJETOS



1.3 – O PAPEL DO GERENTE DE PROJETOS



“ Um Projeto de grande porte e uma Orquestra Sinfônica são formados por muitos membros, e a cada um cabe um papel diferente. Uma grande orquestra pode ter mais de 100 músicos conduzidos por um Maestro. Da mesma forma, um Projeto pode ter mais de 100 membros, liderados por um Gerente de Projeto”.

1.3 – O PAPEL DO GERENTE DE PROJETOS



- “Os dois Líderes começam pela análise da **Visão, da Missão, e dos Objetivos** de suas respectivas Organizações, para garantir o alinhamento com seus produtos.”
- Os Líderes usam a sua interpretação da **Identidade Organizacional** para comunicar e motivar as suas Equipes no sentido da conclusão bem sucedida de seus Objetivos.”

1.3 – O PAPEL DO GERENTE DE PROJETOS



- “Não se espera que o Gerente de Projetos desempenhe todas as funções do Projeto, mas deve ter os conhecimentos do Gerenciamento de Projetos, conhecimento técnico, compreensão e experiência.”
- “O Gerente de Projeto fornece à Equipe do Projeto a Liderança, o Planejamento e a Coordenação por meio da Comunicação, seja escrita (Documentos de Projeto), seja a verbal em tempo real, através de Reuniões.”

1.3 – O PAPEL DO GERENTE DE PROJETOS



O TRIÂNGULO DE TALENTOS DO PMI

1.3 – O PAPEL DO GERENTE DE PROJETOS

Gerenciamento Técnico do Projeto:

Conhecimentos, habilidades e comportamentos relativos a domínios específicos de Gerenciamento de Projetos, Programas e Portfólios. São os aspectos técnicos da execução da função Gerente de Projeto.



1.3 – O PAPEL DO GERENTE DE PROJETOS

LIDERANÇA:

Conhecimentos, habilidades e comportamentos necessários para orientar, motivar e dirigir uma equipe, para ajudar a organização a atingir suas metas de negócio.



1.3 – O PAPEL DO GERENTE DE PROJETOS

GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO E DE NEGÓCIOS

Conhecimento e expertise no Setor e na Organização, de forma a melhorar o desempenho e fornecer melhor os resultados do negócio.



1.3 – O PAPEL DO GERENTE DE PROJETOS

LIDERANÇA:

- Ser um visionário;
- Ser otimista e positivo;
- Ser colaborativo;

Gerenciar relacionamentos e conflitos através de:

- Construção de confiança;
- Solução de preocupações;
- Busca de consenso;
- Balanceamento de metas concorrentes e opostas;
- Aplicação de habilidades de persuasão, negociação, compromisso e resolução de conflitos;
- Desenvolvimento e cultivo de redes pessoais e profissionais;
- Tomada de uma visão de longo prazo de que os relacionamentos são tão importantes quanto o projeto; e
- Desenvolver e aplicar constantemente a perspicácia política.



1.3 – O PAPEL DO GERENTE DE PROJETOS

LIDERANÇA:

Comunicação:

- Dedicar tempo suficiente comunicando-se (pesquisas mostram que os melhores gerentes de projetos gastam cerca de 90% do tempo comunicando-se);
- Administração expectativas;
- Aceite de feedback de forma positiva;
- Fornecimento de feedback de forma construtiva; e
- Manutenção de uma conduta de respeito (ajudar os outros a manter suas autonomias), ser cortês e amigável, gentil, honesto, confiável, leal e ético;
- Demonstração de integridade e sensibilidade cultural, coragem, capacidade de solucionar problemas e tomada de decisão;
- Reconhecimento aos outros quando devido;
- Ser um aprendiz por toda a vida, orientado aos resultados e a ação.



1.3 – O PAPEL DO GERENTE DE PROJETOS



ARQUIVO
60 CARACTERÍSTICA DE UM
GESTOR TRANSFORMADOR

1.4 – MELHORES PRÁTICAS DE GP

Em meados do século XX, os gerentes de projeto começaram a buscar o reconhecimento do Gerenciamento de Projetos como profissão. Um aspecto desse trabalho envolveu obter um acordo sobre o conjunto de conhecimentos (BOK, sigla em inglês de “body of knowledge”) em gerenciamento de projetos. Este conjunto de conhecimentos acabou ficando conhecido como Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (**PMBOK**).


1.4 – MELHORES PRÁTICAS DE GP

O **PMI (Program Management Institute)** desenvolveu e publicou Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®). O PMI define o Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (PMBOK) como um termo que descreve o conhecimento no âmbito da profissão de gerenciamento de projetos. O conhecimento em gerenciamento de projetos inclui práticas tradicionais comprovadas amplamente aplicadas, bem como práticas inovadoras que estão surgindo na profissão.


1.4 – MELHORES PRÁTICAS DE GP

Este Guia PMBOK® é diferente de uma metodologia. Uma metodologia é um sistema de práticas, técnicas, procedimentos e regras usadas por aqueles que trabalham numa disciplina. Este Guia PMBOK® é uma base sobre a qual as organizações podem criar metodologias, políticas, procedimentos, regras, ferramentas e técnicas e fases do ciclo de vida necessários para a prática do gerenciamento de projetos.

1.2 – O AMBIENTE DE PROJETOS

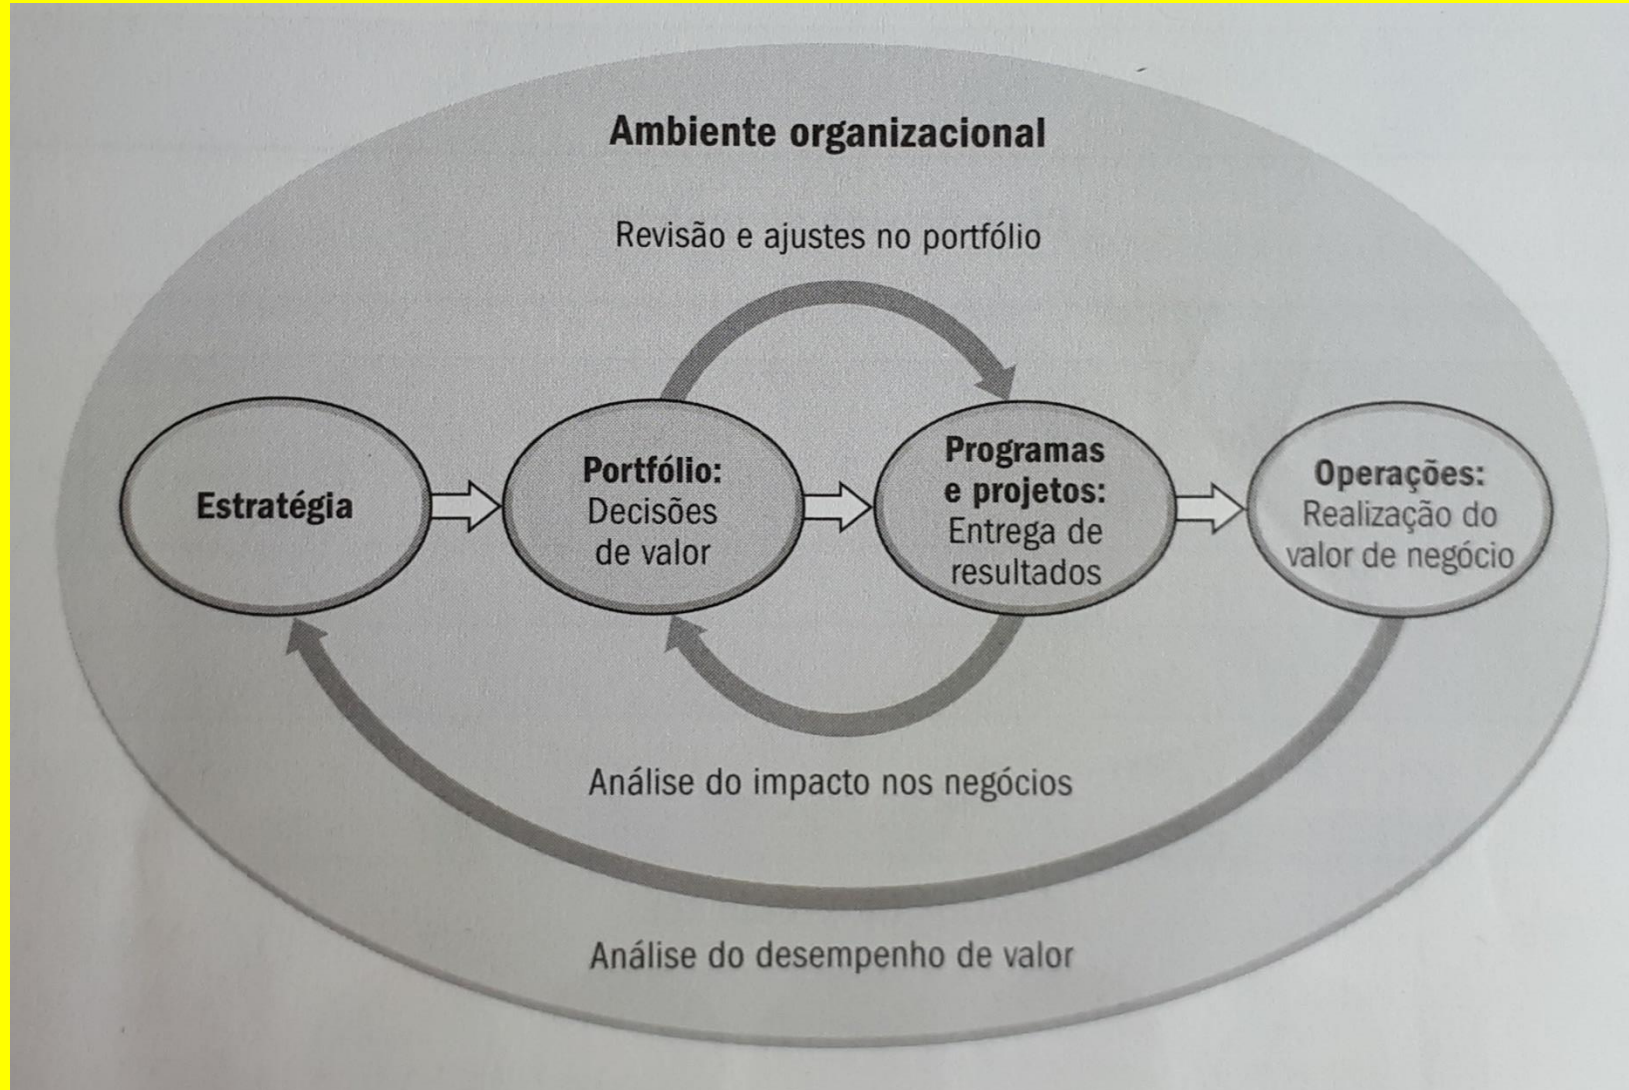

1.4 – MELHORES PRÁTICAS DE GP

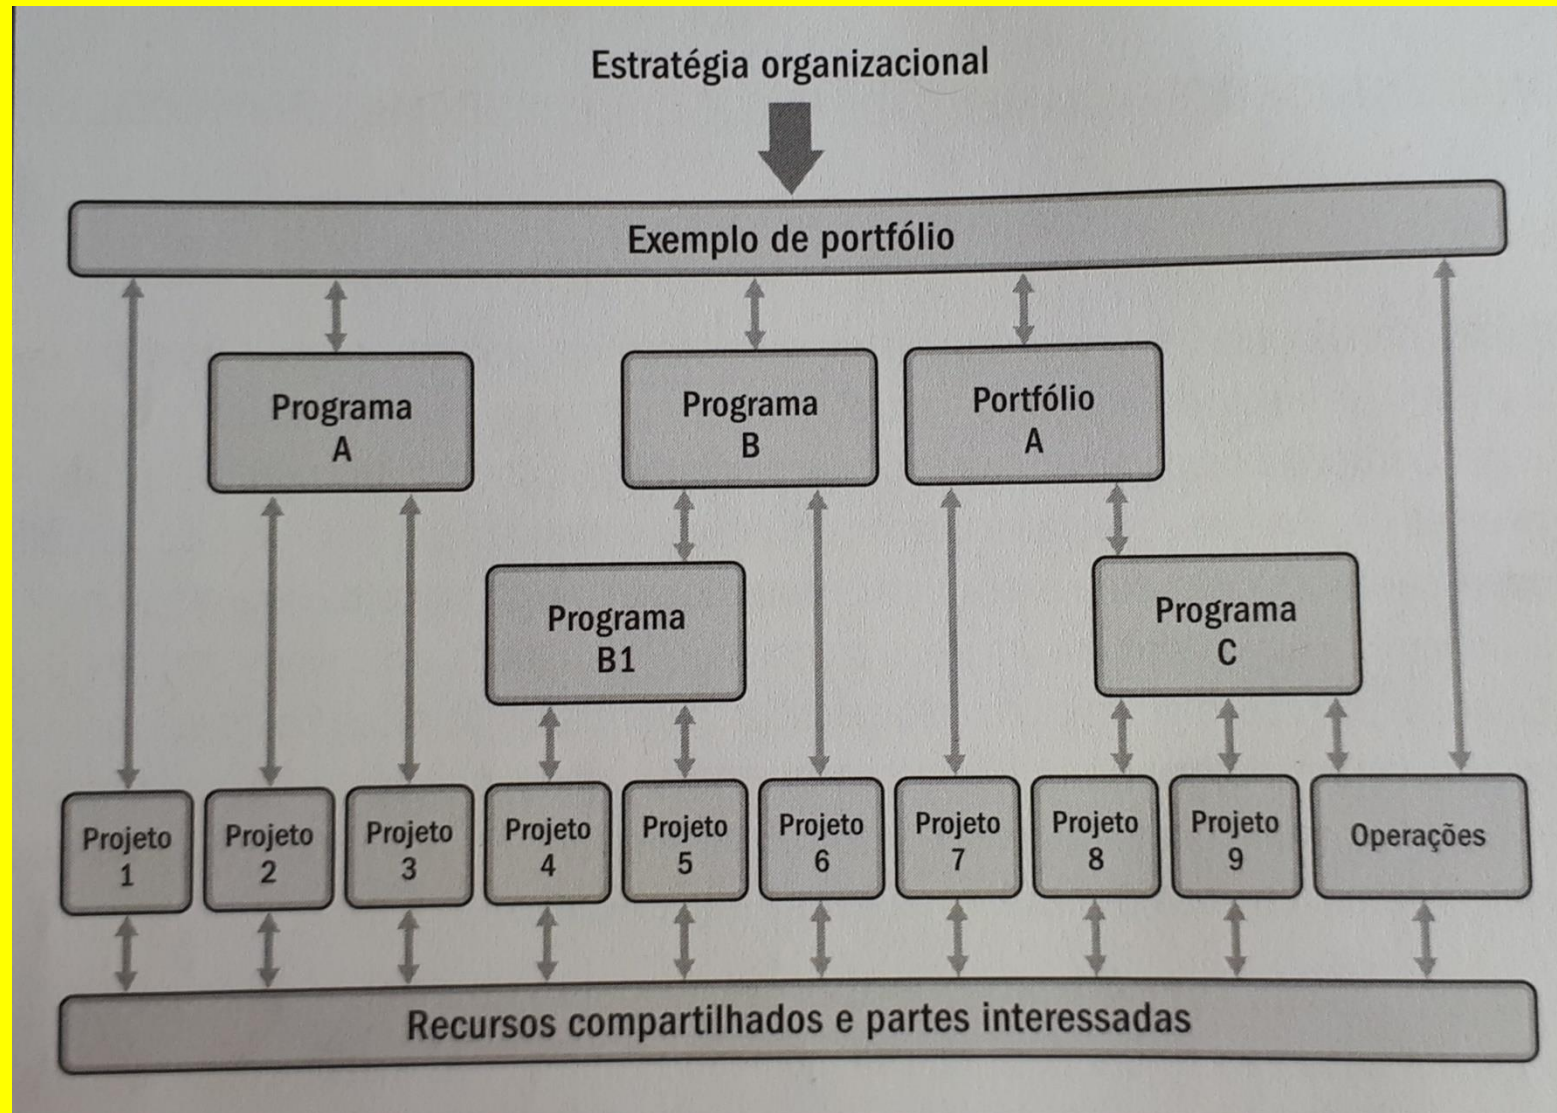

1.4 – MELHORES PRÁTICAS DE GP

Gerenciamento de Projetos Organizacionais			
	Projetos	Programas	Portfólios
Definição	Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único.	Um programa é um grupo de projetos, programas subsidiários e atividades de programa relacionados, gerenciados de modo coordenado visando a obtenção de benefícios que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente.	Um portfólio é um conjunto de projetos, programas, portfólios subsidiários e operações gerenciados em grupo para alcançar objetivos estratégicos.
Escopo	Os projetos têm objetivos definidos. O escopo é elaborado progressivamente ao longo do ciclo de vida do projeto.	Os programas têm um escopo que abrange os escopos dos componentes do programa. Os programas produzem benefícios para uma organização ao garantir que as saídas e resultados dos componentes do programa sejam entregues de forma coordenada e complementar.	Os portfólios têm um escopo organizacional que muda com os objetivos estratégicos da organização.
Mudança	Os gerentes de projetos esperam mudanças e implementam processos para manter a mudança gerenciada e controlada.	Os programas são gerenciados de uma forma que aceita as mudanças e se adapta a elas, conforme necessário, para otimizar a entrega de benefícios à medida que os componentes do programa entregam resultados e/ou saídas.	Os gerentes de portfólio monitoram continuamente as mudanças nos ambientes internos e externos mais abrangentes.
Planejamento	Os gerentes do projeto elaboram progressivamente informações de alto nível em planos detalhados ao longo do ciclo de vida do projeto.	Os programas são gerenciados usando planos de alto nível que monitoram as interdependências e o progresso dos componentes do programa. Os planos de programa também são usados para orientar o planejamento em nível de componentes.	Os gerentes de portfólio criam e mantêm os processos necessários e a comunicação relativa ao portfólio agregado.
Gerenciamento	Os gerentes do projeto gerenciam a equipe do projeto para cumprir os objetivos do projeto.	Os programas são gerenciados por gerentes de programa, que garantem que os benefícios do programa sejam entregues conformes esperado, coordenando as atividades dos componentes de um programa.	Os gerentes de portfólio podem administrar ou coordenar o pessoal de gerenciamento de portfólio, ou o pessoal do programa e do projeto que tenha responsabilidades de prestação de contas sobre o portfólio agregado.
Monitoramento	Os gerentes do projeto monitoram e controlam o trabalho de produzir os produtos, serviços ou resultados que o projeto pretendia produzir.	Os gerentes do programa monitoram o progresso dos componentes do programa para que garantir as metas gerais, os cronogramas, o orçamento e os benefícios do programa serão cumpridos.	Os gerentes de portfólio monitoram mudanças estratégicas e agregam alocação de recursos, resultados de desempenho e risco do portfólio.
Sucesso	O sucesso é medido por qualidade do produto e do projeto, cumprimento de prazos, conformidade com o orçamento e grau de satisfação do cliente.	O sucesso de um programa é medido pela capacidade do programa de entregar seus benefícios esperados para uma organização, e pela eficiência e eficácia do programa para entregar esses benefícios.	O sucesso é medido em termos do desempenho do investimento agregado e da realização de benefício do portfólio.

1.4 – MELHORES PRÁTICAS DE GP

AREAS DE CONHECIMENTO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Área de Conhecimento é uma área identificada de gerenciamento de projetos definida por seus requisitos de conhecimento e descrita em termos dos processos que a compõem: práticas, entradas, saídas, ferramentas e técnicas.

Embora sejam inter-relacionadas, as Áreas de Conhecimento são definidas separadamente do ponto de vista do gerenciamento de projetos.

1.4 – MELHORES PRÁTICAS DE GP

AREAS DE CONHECIMENTO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

As dez Áreas de Conhecimento identificadas no guia PMBOK são utilizadas na maioria dos projetos e na maior parte das vezes. As dez áreas de conhecimento descritas neste guia são:

1.4 – MELHORES PRÁTICAS DE GP

AREAS DE CONHECIMENTO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS



1.4 – MELHORES PRÁTICAS DE GP

AREAS DE CONHECIMENTO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Gerenciamento da Integração do Projeto: Inclui os processos e as atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades de gerenciamento de projetos nos Grupos de Processos de Gerenciamento de Projetos.

Visão Geral do Gerenciamento da Integração do Projeto

4.1 Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto

- 1 Entradas
 - 1 Documentos de negócios
 - 2 Acordos
 - 3 Fatores ambientais da empresa
 - 4 Ativos de processos organizacionais
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Opinião especializada
 - 2 Coleta de dados
 - 3 Habilidades interpessoais e de equipe
 - 4 Reuniões
- 3 Saídas
 - 1 Termo de abertura do projeto
 - 2 Registro de premissas

4.5 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto

- 1 Entradas
 - 1 Plano de gerenciamento do projeto
 - 2 Documentos do projeto
 - 3 Informações sobre o desempenho do trabalho
 - 4 Acordos
 - 5 Fatores ambientais da empresa
 - 6 Ativos de processos organizacionais
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Opinião especializada
 - 2 Análise de dados
 - 3 Tomada de decisão
 - 4 Reuniões
- 3 Saídas
 - 1 Relatórios de desempenho do trabalho
 - 2 Solicitações de mudança
 - 3 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - 4 Atualizações de documentos do projeto

4.2 Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto

- 1 Entradas
 - 1 Termo de abertura do projeto
 - 2 Saídas de Outros Processos
 - 3 Fatores ambientais da empresa
 - 4 Ativos de processos organizacionais
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Opinião especializada
 - 2 Coleta de dados
 - 3 Habilidades interpessoais e de equipe
 - 4 Reuniões
- 3 Saídas
 - 1 Plano de gerenciamento do projeto

4.6 Realizar o Controle Integrado de Mudanças

- 1 Entradas
 - 1 Plano de gerenciamento do projeto
 - 2 Documentos do projeto
 - 3 Relatórios de desempenho do trabalho
 - 4 Solicitações de mudança
 - 5 Fatores ambientais da empresa
 - 6 Ativos de processos organizacionais
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Opinião especializada
 - 2 Ferramentas de controle de mudanças
 - 3 Análise de dados
 - 4 Tomada de decisão
 - 5 Reuniões
- 3 Saídas
 - 1 Solicitações de mudança aprovadas
 - 2 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - 3 Atualizações de documentos do projeto

4.3 Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto

- 1 Entradas
 - 1 Plano de gerenciamento do projeto
 - 2 Documentos do projeto
 - 3 Solicitações de mudança aprovadas
 - 4 Fatores ambientais da empresa
 - 5 Ativos de processos organizacionais
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Opinião especializada
 - 2 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
 - 3 Reuniões
- 3 Saídas
 - 1 Entregas
 - 2 Dados de desempenho do trabalho
 - 3 Registro das questões
 - 4 Solicitações de mudança
 - 5 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - 6 Atualizações de documentos do projeto
 - 7 Atualizações de ativos de processos organizacionais

4.7 Encerrar o Projeto ou Fase

- 1 Entradas
 - 1 Termo de abertura do projeto
 - 2 Plano de gerenciamento do projeto
 - 3 Documentos do projeto
 - 4 Entregas aceitas
 - 5 Documentos de negócios
 - 6 Acordos
 - 7 Documentação de aquisições
 - 8 Ativos de processos organizacionais
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Opinião especializada
 - 2 Análise de dados
 - 3 Reuniões
- 3 Saídas
 - 1 Atualizações de documentos do projeto
 - 2 Transição do produto, serviço ou resultado final
 - 3 Relatório final
 - 4 Atualizações de ativos de processos organizacionais

4.4 Gerenciar o Conhecimento do Projeto

- 1 Entradas
 - 1 Plano de gerenciamento do projeto
 - 2 Documentos do projeto
 - 3 Entregas
 - 4 Fatores ambientais da empresa
 - 5 Ativos de processos organizacionais
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Opinião especializada
 - 2 Gerenciamento de conhecimentos
 - 3 Information management
 - 4 Gerenciamento de informações, Habilidades interpessoais e de equipe
- 3 Saídas
 - 1 Registro das lições aprendidas
 - 2 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - 3 Atualizações de ativos de processos organizacionais

1.4 – MELHORES PRÁTICAS DE GP

AREAS DE CONHECIMENTO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Gerenciamento do **escopo** do projeto:

Inclui os processos necessários para assegurar que o projeto contemple todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para que o mesmo termine com sucesso.

Visão geral do Gerenciamento de Escopo do Projeto

5.1 Planejar o Gerenciamento de Escopo

- Entradas
 - Termo de abertura do projeto
 - Plano de gerenciamento do projeto
 - Fatores ambientais da empresa
 - Ativos de processos organizacionais
- Ferramentas e técnicas
 - Opinião especializada
 - Análise de dados
 - Reuniões
- Saídas
 - Plano de gerenciamento do escopo
 - Plano de gerenciamento dos requisitos

5.4 Criar a EAP

- Entradas
 - Plano de gerenciamento do projeto
 - Documentos do projeto
 - Fatores ambientais da empresa
 - Ativos de processos organizacionais
- Ferramentas e técnicas
 - Opinião especializada
 - Decomposição
- Saídas
 - Linha de base do escopo
 - Atualizações de documentos do projeto

5.2 Coletar os Requisitos

- Entradas
 - Termo de abertura do projeto
 - Plano de gerenciamento do projeto
 - Documentos do projeto
 - Documentos de negócios
 - Acordos
 - Fatores ambientais da empresa
 - Ativos de processos organizacionais
- Ferramentas e técnicas
 - Opinião especializada
 - Coleta de dados
 - Análise de dados
 - Tomada de decisão
 - Representação de dados
 - Habilidades interpessoais e de equipe
 - Diagramas de contexto
 - Protótipos
- Saídas
 - Documentação dos requisitos
 - Matriz de rastreabilidade dos requisitos

5.5 Validar o Escopo

- Entradas
 - Plano de gerenciamento do projeto
 - Documentos do projeto
 - Entregas verificadas
 - Dados de desempenho do trabalho
- Ferramentas e técnicas
 - Inspecção
 - Tomada de decisão
- Saídas
 - Entregas aceitas
 - Informações sobre o desempenho do trabalho
 - Solicitações de mudança
 - Atualizações de documentos do projeto

5.3 Definir o Escopo

- Entradas
 - Termo de abertura do projeto
 - Plano de gerenciamento do projeto
 - Documentos do projeto
 - Fatores ambientais da empresa
 - Ativos de processos organizacionais
- Ferramentas e técnicas
 - Opinião especializada
 - Análise de dados
 - Tomada de decisão
 - Habilidades interpessoais e de equipe
 - Análise de produto
- Saídas
 - Especificação do escopo do projeto
 - Atualizações de documentos do projeto

5.6 Controlar o Escopo

- Entradas
 - Plano de gerenciamento do projeto
 - Documentos do projeto
 - Dados de desempenho do trabalho
 - Ativos de processos organizacionais
- Ferramentas e técnicas
 - Análise de dados
- Saídas
 - Informações sobre o desempenho do trabalho
 - Solicitações de mudança
 - Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - Atualizações de documentos do projeto

1.4 – MELHORES PRÁTICAS DE GP

AREAS DE CONHECIMENTO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Gerenciamento do **Cronograma** do Projeto:

Inclui os processos necessários para gerenciar o término pontual do projeto.

Visão Geral do Gerenciamento do Cronograma do Projeto

6.1 Planejar o Gerenciamento do Cronograma

- 1 Entradas
 - 1 Termo de abertura do projeto
 - 2 Plano de gerenciamento do projeto
 - 3 Fatores ambientais da empresa
 - 4 Ativos de processos organizacionais
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Opinião especializada
 - 2 Análise de dados
 - 3 Reuniões
- 3 Saídas
 - 1 Plano de gerenciamento do cronograma

6.4 Estimar as Durações das Atividades

- 1 Entradas
 - 1 Plano de gerenciamento do projeto
 - 2 Documentos do projeto
 - 3 Fatores ambientais da empresa
 - 4 Ativos de processos organizacionais
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Opinião especializada
 - 2 Estimativa análoga
 - 3 Estimativa paramétrica
 - 4 Estimativa de três pontos
 - 5 Estimativa *bottom-up*
 - 6 Análise de dados
 - 7 Tomada de decisão
 - 8 Reuniões
- 3 Saídas
 - 1 Estimativas de duração
 - 2 Bases das estimativas
 - 3 Atualizações de documentos do projeto

6.2 Definir as Atividades

- 1 Entradas
 - 1 Plano de gerenciamento do projeto
 - 2 Fatores ambientais da empresa
 - 3 Ativos de processos organizacionais
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Opinião especializada
 - 2 Decomposição
 - 3 Planejamento em ondas sucessivas
 - 4 Reuniões
- 3 Saídas
 - 1 Lista de atividades
 - 2 Atributos das atividades
 - 3 Lista de marcos
 - 4 Solicitações de mudança
 - 5 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto

6.5 Desenvolver o Cronograma

- 1 Entradas
 - 1 Plano de gerenciamento do projeto
 - 2 Documentos do projeto
 - 3 Acordos
 - 4 Fatores ambientais da empresa
 - 5 Ativos de processos organizacionais
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Análise de rede do cronograma
 - 2 Método do caminho crítico
 - 3 Otimização de recursos
 - 4 Análise de dados
 - 5 Antecipações e esperas
 - 6 Compressão do cronograma
 - 7 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
 - 8 Planejamento ágil de grandes entregas
- 3 Saídas
 - 1 Linha de base do cronograma
 - 2 Cronograma do projeto
 - 3 Dados do cronograma
 - 4 Calendários do projeto
 - 5 Solicitações de mudança
 - 6 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - 7 Atualizações de documentos do projeto

6.3 Sequenciar as Atividades

- 1 Entradas
 - 1 Plano de gerenciamento do projeto
 - 2 Documentos do projeto
 - 3 Fatores ambientais da empresa
 - 4 Ativos de processos organizacionais
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Método do diagrama de precedência
 - 2 Integração e determinação de dependência
 - 3 Antecipações e esperas
 - 4 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- 3 Saídas
 - 1 Diagrama de rede do cronograma do projeto
 - 2 Atualizações de documentos do projeto

6.6 Controlar o Cronograma

- 1 Entradas
 - 1 Plano de gerenciamento do projeto
 - 2 Documentos do projeto
 - 3 Dados de desempenho do trabalho
 - 4 Ativos de processos organizacionais
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Análise de dados
 - 2 Método do caminho crítico
 - 3 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
 - 4 Otimização de recursos
 - 5 Antecipações e esperas
 - 6 Compressão do cronograma
- 3 Saídas
 - 1 Informações sobre o desempenho do trabalho
 - 2 Previsões do cronograma
 - 3 Solicitações de mudança
 - 4 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - 5 Atualizações de documentos do projeto

1.4 – MELHORES PRÁTICAS DE GP

AREAS DE CONHECIMENTO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Gerenciamento dos **Custos** do Projeto:

Inclui os processos envolvidos em planejamento, estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle dos custos, de modo que o projeto possa ser terminado dentro do orçamento aprovado.

Visão Geral do Gerenciamento dos Custos do Projeto

7.1 Planejar o Gerenciamento dos Custos

- .1 Entradas
 - .1 Termo de abertura do projeto
 - .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - .3 Fatores ambientais da empresa
 - .4 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Análise de dados
 - .3 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Plano de gerenciamento dos custos

7.2 Estimar os Custos

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Fatores ambientais da empresa
 - .4 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Estimativa análoga
 - .3 Estimativa paramétrica
 - .4 Estimativa *bottom-up*
 - .5 Estimativa de três pontos
 - .6 Análise de dados
 - .7 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
 - .8 Tomada de decisão
- .3 Saídas
 - .1 Estimativa de custos
 - .2 Bases das estimativas
 - .3 Atualizações de documentos do projeto

7.4 Controlar os Custos

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Requisitos de recursos financeiros do projeto
 - .4 Dados de desempenho do trabalho
 - .5 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Análise de dados
 - .3 Índice de desempenho para término
 - .4 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- .3 Saídas
 - .1 Informações sobre o desempenho do trabalho
 - .2 Previsões de custos
 - .3 Solicitações de mudança
 - .4 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .5 Atualizações de documentos do projeto

7.3 Determinar o Orçamento

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Documentos de negócio
 - .4 Acordos
 - .5 Fatores ambientais da empresa
 - .6 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Agregação de custos
 - .3 Análise de dados
 - .4 Revisão de informações históricas
 - .5 Reconciliação dos limites de recursos financeiros
 - .6 Financiamento
- .3 Saídas
 - .1 Linha de base dos custos
 - .2 Requisitos de recursos financeiros do projeto
 - .3 Atualizações de documentos do projeto

1.4 – MELHORES PRÁTICAS DE GP

AREAS DE CONHECIMENTO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Gerenciamento da **Qualidade** do Projeto:

Inclui os processos para incorporação da política de qualidade da organização com relação ao planejamento, gerenciamento e controle dos requisitos de qualidade do projeto e do produto para atender as expectativas das partes interessadas.

Planejar o Gerenciamento da Qualidade

Entradas

- .1 Termo de abertura do projeto
- .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento dos requisitos
 - Plano de gerenciamento dos riscos
 - Plano de engajamento das partes interessadas
 - Linha de base do escopo
- .3 Documentos do projeto
 - Registro de premissas
 - Documentação dos requisitos
 - Matriz de rastreabilidade dos requisitos
 - Registro dos riscos
 - Registro das partes interessadas
- .4 Fatores ambientais da empresa
- .5 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Coleta de dados
 - *Benchmarking*
 - *Brainstorming*
 - Entrevistas
- .3 Análise de dados
 - Análise de custo-benefício
 - Custo da qualidade
- .4 Tomada de decisão
 - Análise de decisão envolvendo critérios múltiplos
- .5 Representação de dados
 - Fluxogramas
 - Modelos lógicos de dados
 - Diagramas matriciais
 - Mapeamento mental
- .6 Planejamento de testes e inspeções
- .7 Reuniões

Saídas

- .1 Plano de gerenciamento da qualidade
- .2 Métricas da qualidade
- .3 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento dos riscos
 - Linha de base do escopo
- .4 Atualizações de documentos do projeto
 - Registro das lições aprendidas
 - Matriz de rastreabilidade dos requisitos
 - Registro dos riscos
 - Registro das partes interessadas

1.4 – MELHORES PRÁTICAS DE GP

AREAS DE CONHECIMENTO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Gerenciamento dos **Recursos** do Projeto:

Inclui os processos para identificar, adquirir e gerenciar os recursos necessários para a conclusão bem-sucedida do projeto .

Visão Geral do Gerenciamento dos Recursos do Projeto

9.1 Planejar o Gerenciamento dos Recursos

- .1 Entradas
 - .1 Termo de abertura do projeto
 - .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - .3 Documentos do projeto
 - .4 Fatores ambientais da empresa
 - .5 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Representação de dados
 - .3 Teoria organizacional
 - .4 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Plano de gerenciamento dos recursos
 - .2 Termo de nomeação da equipe
 - .3 Atualizações de documentos do projeto

9.4 Desenvolver a Equipe

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Fatores ambientais da empresa
 - .4 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Agrupamento
 - .2 Equipes virtuais
 - .3 Tecnologias de comunicações
 - .4 Habilidades interpessoais e de equipe
 - .5 Reconhecimento e recompensas
 - .6 Treinamento
 - .7 Avaliações individuais e da equipe
 - .8 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Avaliações do desempenho da equipe
 - .2 Solicitações de mudança
 - .3 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .4 Atualizações de documentos do projeto
 - .5 Atualizações nos fatores ambientais da empresa
 - .6 Atualizações de ativos de processos organizacionais

9.2 Estimar os Recursos das Atividades

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Fatores ambientais da empresa
 - .4 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Estimativa *bottom-up*
 - .3 Estimativa análoga
 - .4 Estimativa paramétrica
 - .5 Análise de dados
 - .6 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
 - .7 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Requisitos de recursos
 - .2 Bases das estimativas
 - .3 Estrutura analítica dos recursos
 - .4 Atualizações de documentos do projeto

9.5 Gerenciar a Equipe

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Relatórios de desempenho do trabalho
 - .4 Avaliações do desempenho da equipe
 - .5 Fatores ambientais da empresa
 - .6 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Habilidades interpessoais e de equipe
 - .2 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- .3 Saídas
 - .1 Solicitações de mudança
 - .2 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .3 Atualizações de documentos do projeto
 - .4 Atualizações nos fatores ambientais da empresa

9.3 Adquirir Recursos

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Fatores ambientais da empresa
 - .4 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Tomada de decisão
 - .2 Habilidades interpessoais e de equipe
 - .3 Pré-designação
 - .4 Equipes virtuais
- .3 Saídas
 - .1 Designações de recursos físicos
 - .2 Designações da equipe do projeto
 - .3 Calendários dos recursos
 - .4 Solicitações de mudança
 - .5 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .6 Atualizações de documentos do projeto
 - .7 Atualizações nos fatores ambientais da empresa
 - .8 Atualizações de ativos de processos organizacionais

9.6 Controlar os Recursos

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Dados de desempenho do trabalho
 - .4 Acordos
 - .5 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Análise de dados
 - .2 Solução de problemas
 - .3 Habilidades interpessoais e de equipe
 - .4 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- .3 Saídas
 - .1 Informações sobre o desempenho do trabalho
 - .2 Solicitações de mudança
 - .3 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .4 Atualizações de documentos do projeto

1.4 – MELHORES PRÁTICAS DE GP

AREAS DE CONHECIMENTO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Gerenciamento das **Comunicações** do Projeto:

Inclui os processos necessários para assegurar que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e finalmente organizadas de maneira oportuna e apropriada.

Visão Geral do Gerenciamento das Comunicações do Projeto

10.1 Planejar o Gerenciamento das Comunicações

- .1 Entradas
 - .1 Termo de abertura do projeto
 - .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - .3 Documentos do projeto
 - .4 Fatores ambientais da empresa
 - .5 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Análise de requisitos das comunicações
 - .3 Tecnologias de comunicações
 - .4 Modelos de comunicações
 - .5 Métodos de comunicação
 - .6 Habilidades interpessoais e de equipe
 - .7 Representação de dados
 - .8 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Plano de gerenciamento das comunicações
 - .2 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .3 Atualização de documentos do projeto

10.2 Gerenciar as Comunicações

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Relatórios de desempenho do trabalho
 - .4 Fatores ambientais da empresa
 - .5 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Tecnologias de comunicações
 - .2 Métodos de comunicação
 - .3 Habilidades de comunicação
 - .4 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
 - .5 Relatórios de projeto
 - .6 Habilidades interpessoais e de equipe
 - .7 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Comunicações do projeto
 - .2 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .3 Atualizações de documentos do projeto
 - .4 Atualizações de ativos de processos organizacionais

10.3 Monitorar as Comunicações

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Dados de desempenho do trabalho
 - .4 Fatores ambientais da empresa
 - .5 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
 - .3 Representação de dados
 - .4 Habilidades interpessoais e de equipe
 - .5 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Informações sobre o desempenho do trabalho
 - .2 Solicitações de mudança
 - .3 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .4 Atualizações de documentos do projeto

1.4 – MELHORES PRÁTICAS DE GP

AREAS DE CONHECIMENTO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Gerenciamento dos **Riscos** do Projeto:

Inclui os processos de condução de planejamento, identificação e análise de gerenciamento de risco, planejamento de resposta, implementação de resposta e monitoramento de risco em um projeto.

Visão geral do Gerenciamento dos Riscos do Projeto

11.1 Planejar o Gerenciamento dos Riscos

- 1 Entradas
 - 1 Termo de abertura do projeto
 - 2 Plano de gerenciamento do projeto
 - 3 Documentos do projeto
 - 4 Fatores ambientais da empresa
 - 5 Ativos de processos organizacionais
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Opinião especializada
 - 2 Análise de dados
 - 3 Reuniões
- 3 Saídas
 - 1 Plano de gerenciamento dos riscos

11.5 Planejar as Respostas aos Riscos

- 1 Entradas
 - 1 Plano de gerenciamento do projeto
 - 2 Documentos do projeto
 - 3 Fatores ambientais da empresa
 - 4 Ativos de processos organizacionais
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Opinião especializada
 - 2 Coleta de dados
 - 3 Habilidades interpessoais e de equipe
 - 4 Estratégias para ameaças
 - 5 Estratégias para oportunidades
 - 6 Estratégias de respostas de contingência
 - 7 Estratégias para o risco geral do projeto
 - 8 Análise de dados
 - 9 Tomada de decisão
- 3 Saídas
 - 1 Solicitações de mudança
 - 2 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - 3 Atualizações de documentos do projeto

11.2 Identificar os Riscos

- 1 Entradas
 - 1 Plano de gerenciamento do projeto
 - 2 Documentos do projeto
 - 3 Acordos
 - 4 Documentação de aquisições
 - 5 Fatores ambientais da empresa
 - 6 Ativos de processos organizacionais
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Opinião especializada
 - 2 Coleta de dados
 - 3 Análise de dados
 - 4 Habilidades interpessoais e de equipe
 - 5 Listas de alertas
 - 6 Reuniões
- 3 Saídas
 - 1 Registro dos riscos
 - 2 Relatório de riscos
 - 3 Atualizações de documentos do projeto

11.6 Implementar Respostas aos Riscos

- 1 Entradas
 - 1 Plano de gerenciamento do projeto
 - 2 Documentos do projeto
 - 3 Ativos de processos organizacionais
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Opinião especializada
 - 2 Habilidades interpessoais e de equipe
 - 3 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- 3 Saídas
 - 1 Solicitações de mudança
 - 2 Atualizações de documentos do projeto

11.3 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos

- 1 Entradas
 - 1 Plano de gerenciamento do projeto
 - 2 Documentos do projeto
 - 3 Fatores ambientais da empresa
 - 4 Ativos de processos organizacionais
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Opinião especializada
 - 2 Coleta de dados
 - 3 Análise de dados
 - 4 Habilidades interpessoais e de equipe
 - 5 Categorização dos riscos
 - 6 Representação de dados
 - 7 Reuniões
- 3 Saídas
 - 1 Atualizações de documentos do projeto

11.7 Monitorar os Riscos

- 1 Entradas
 - 1 Plano de gerenciamento do projeto
 - 2 Documentos do projeto
 - 3 Dados de desempenho do trabalho
 - 4 Relatórios de desempenho do trabalho
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Análise de dados
 - 2 Auditorias
 - 3 Reuniões
- 3 Saídas
 - 1 Informações sobre o desempenho do trabalho
 - 2 Solicitações de mudança
 - 3 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - 4 Atualizações de documentos do projeto
 - 5 Atualizações de ativos de processos organizacionais

11.4 Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos

- 1 Entradas
 - 1 Plano de gerenciamento do projeto
 - 2 Documentos do projeto
 - 3 Fatores ambientais da empresa
 - 4 Ativos de processos organizacionais
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Opinião especializada
 - 2 Coleta de dados
 - 3 Habilidades interpessoais e de equipe
 - 4 Representações da Incerteza
 - 5 Análise de dados
- 3 Saídas
 - 1 Atualizações de documentos do projeto

1.4 – MELHORES PRÁTICAS DE GP

AREAS DE CONHECIMENTO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Gerenciamento das **Aquisições** do Projeto:

Inclui os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto.

Visão Geral do Gerenciamento das Aquisições do Projeto

12.1 Planejar o Gerenciamento das Aquisições

- .1 Entradas
 - .1 Termo de abertura do projeto
 - .2 Documentos de negócios
 - .3 Plano de gerenciamento do projeto
 - .4 Documentos do projeto
 - .5 Fatores ambientais da empresa
 - .6 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Coleta de dados
 - .3 Análise de dados
 - .4 Análise para seleção de fontes
 - .5 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Plano de gerenciamento das aquisições
 - .2 Estratégia da aquisição
 - .3 Documentos de licitação
 - .4 Especificação do trabalho das aquisições
 - .5 Análise para seleção de fontes
 - .6 Decisões de fazer ou comprar
 - .7 Estimativas de custos independentes
 - .8 Solicitações de mudança
 - .9 Atualizações de documentos do projeto
 - .10 Atualizações de ativos de processos organizacionais

12.2 Conduzir as Aquisições

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Documentação de aquisições
 - .4 Propostas dos vendedores
 - .5 Fatores ambientais da empresa
 - .6 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Publicidade
 - .3 Reuniões com licitantes
 - .4 Análise de dados
 - .5 Habilidades interpessoais e de equipe
- .3 Saídas
 - .1 Vendedores selecionados
 - .2 Acordos
 - .3 Solicitações de mudança
 - .4 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .5 Atualizações de documentos do projeto
 - .6 Atualizações de ativos de processos organizacionais

12.3 Controlar as Aquisições

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Acordos
 - .4 Documentação de aquisições
 - .5 Solicitações de mudança aprovadas
 - .6 Dados de desempenho do trabalho
 - .7 Fatores ambientais da empresa
 - .8 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Administração de reivindicações
 - .3 Análise de dados
 - .4 Inspeção
 - .5 Auditorias
- .3 Saídas
 - .1 Aquisições encerradas
 - .2 Informações sobre o desempenho do trabalho
 - .3 Atualizações na documentação de aquisições
 - .4 Solicitações de mudança
 - .5 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .6 Atualizações de documentos do projeto
 - .7 Atualizações de ativos de processos organizacionais

1.4 – MELHORES PRÁTICAS DE GP

AREAS DE CONHECIMENTO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Gerenciamento das **Partes Interessadas** do Projeto:

Inclui os processos exigidos para identificar as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados pelo projeto, analisar as expectativas das partes interessadas e seu impacto no projeto, e desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o seu engajamento eficaz nas decisões e execução do projeto.

Visão Geral do Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto

13.1 Identificar as Partes Interessadas

- .1 Entradas
 - .1 Termo de abertura do projeto
 - .2 Documentos de negócios
 - .3 Plano de gerenciamento do projeto
 - .4 Documentos do projeto
 - .5 Acordos
 - .6 Fatores ambientais da empresa
 - .7 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Coleta de dados
 - .3 Análise de dados
 - .4 Representação de dados
 - .5 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Registro das partes interessadas
 - .2 Solicitações de mudança
 - .3 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .4 Atualizações de documentos do projeto

13.2 Planejar o Engajamento das Partes Interessadas

- .1 Entradas
 - .1 Termo de abertura do projeto
 - .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - .3 Documentos do projeto
 - .4 Acordos
 - .5 Fatores ambientais da empresa
 - .6 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Coleta de dados
 - .3 Análise de dados
 - .4 Tomada de decisão
 - .5 Representação de dados
 - .6 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Plano de engajamento das partes interessadas

13.3 Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas


- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Fatores ambientais da empresa
 - .4 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Habilidades de comunicação
 - .3 Habilidades interpessoais e de equipe
 - .4 Regras básicas
 - .5 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Solicitações de mudança
 - .2 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .3 Atualizações de documentos do projeto

13.4 Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Dados de desempenho do trabalho
 - .4 Fatores ambientais da empresa
 - .5 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Análise de dados
 - .2 Tomada de decisão
 - .3 Representação de dados
 - .4 Habilidades de comunicação
 - .5 Habilidades interpessoais e de equipe
 - .6 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Informações sobre o desempenho do trabalho
 - .2 Solicitações de mudança
 - .3 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .4 Atualizações de documentos do projeto

1.4 – MELHORES PRÁTICAS DE GP

GRUPOS DE PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

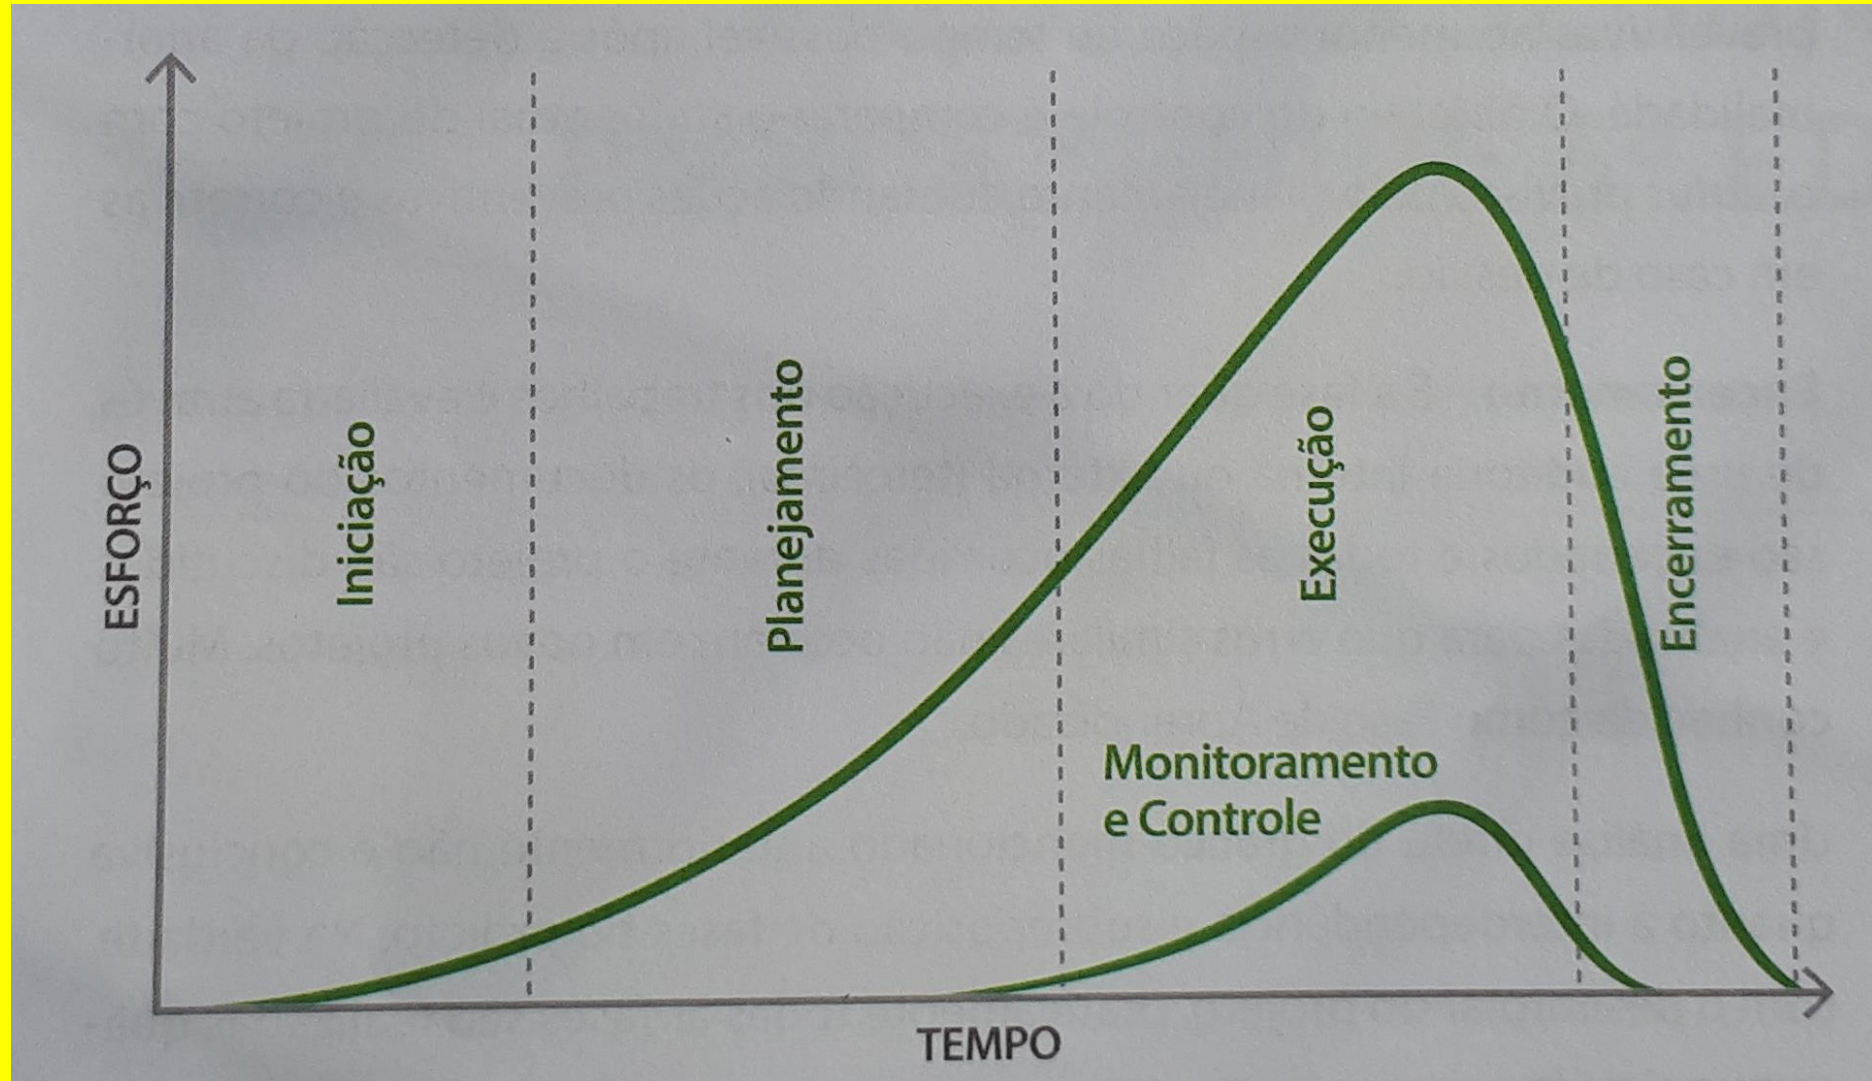


1.4 – MELHORES PRÁTICAS DE GP

EX: GERENCIAMENTO DE ESCOPO



1.4 – MELHORES PRÁTICAS DE GP

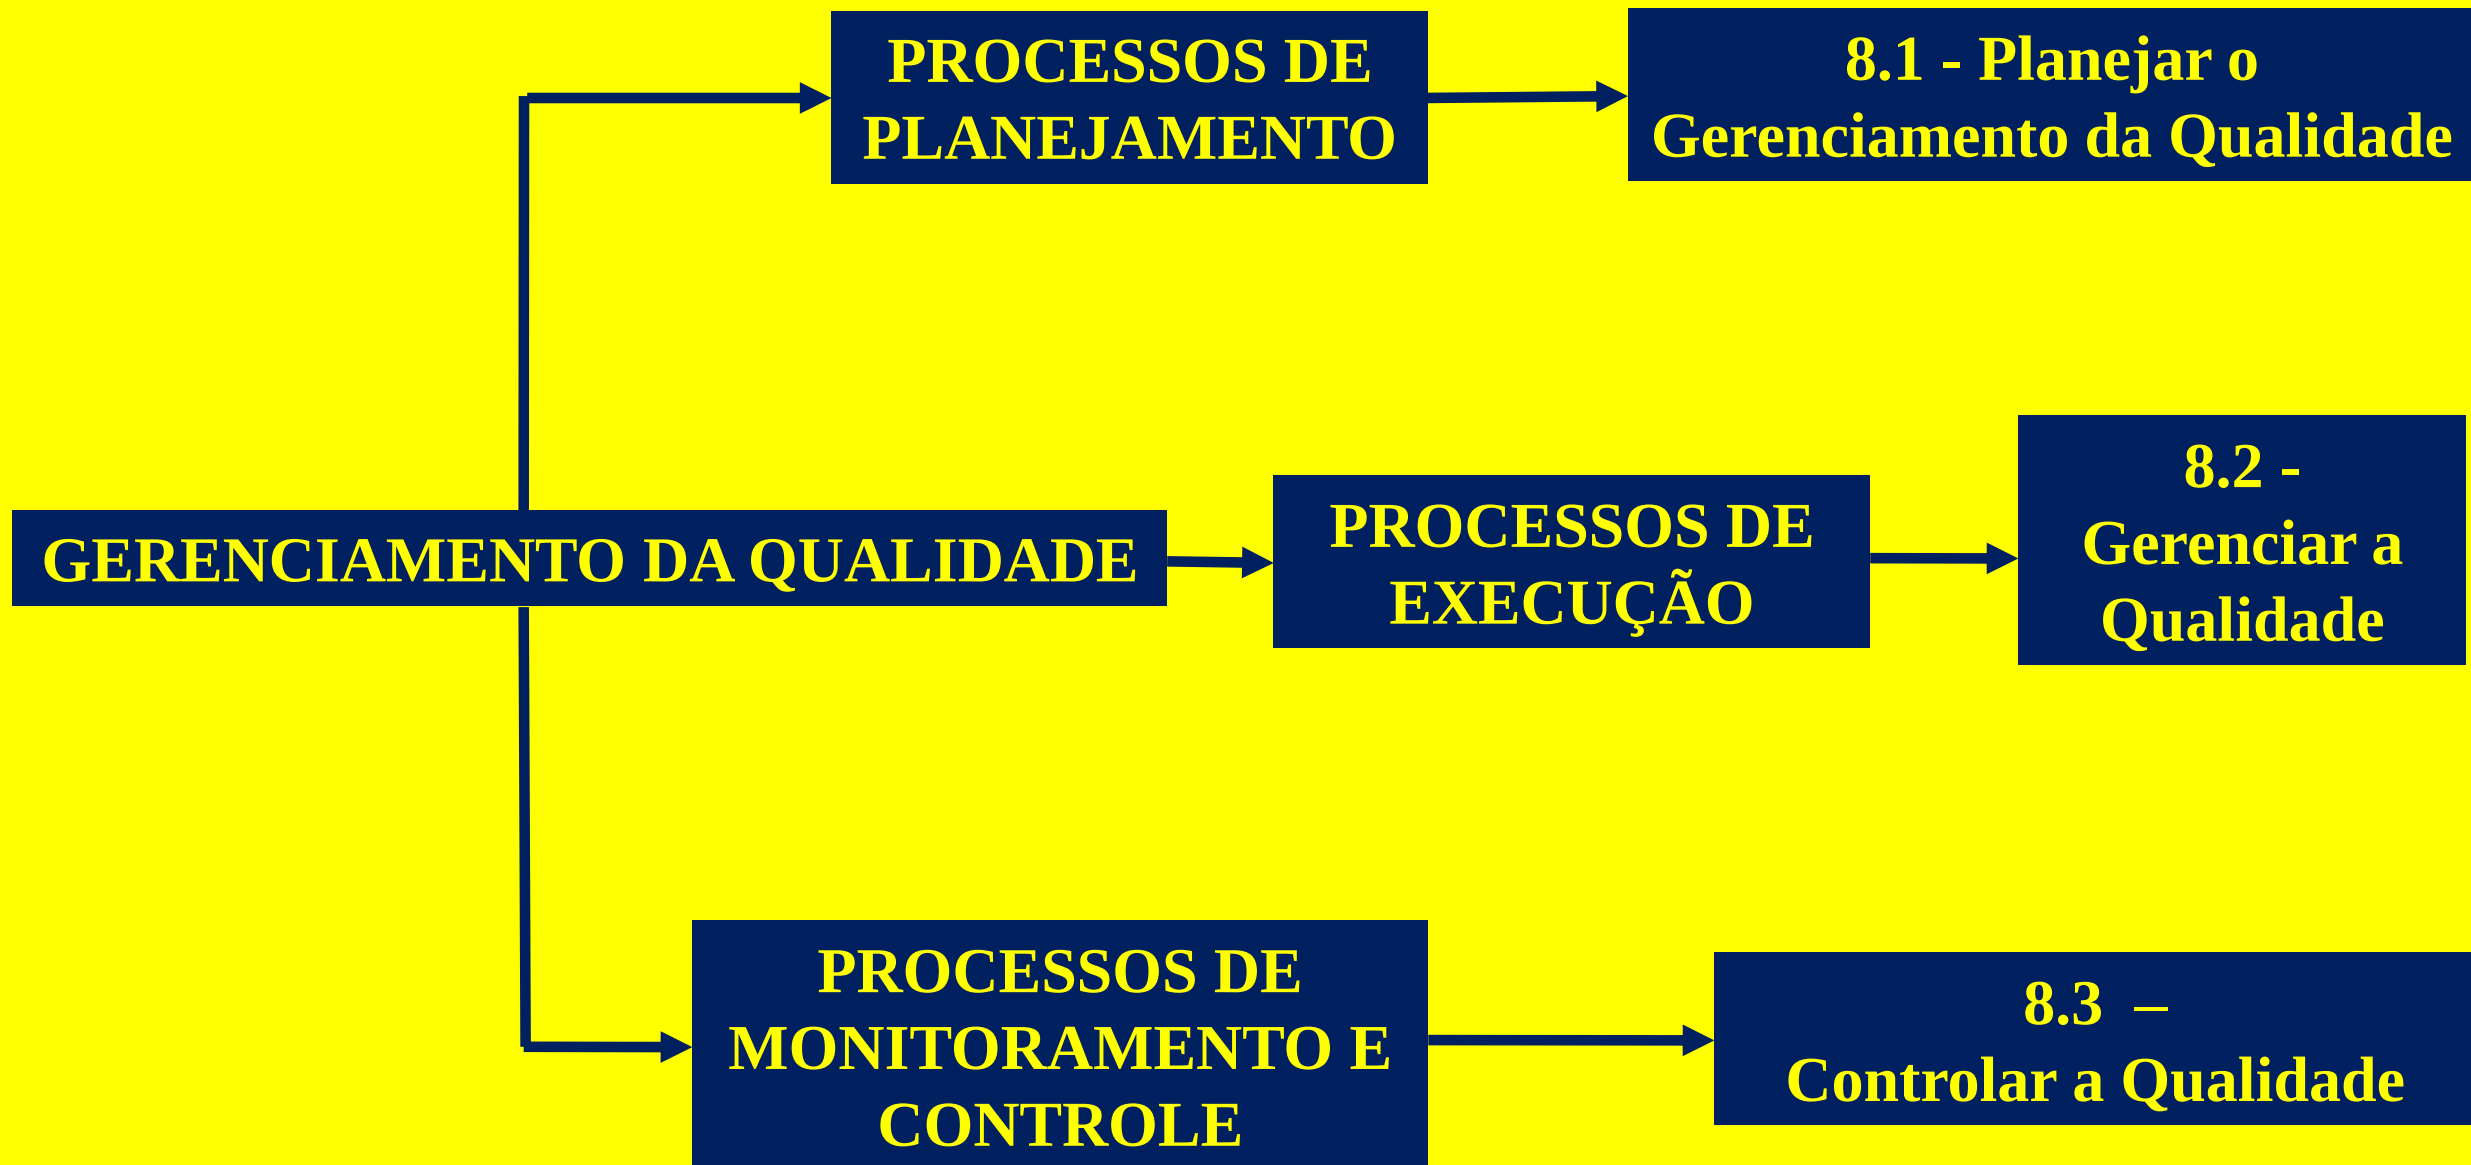

1.4 – MELHORES PRÁTICAS DE GP

GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA

